Documento de Despliegue — LavaRápido Vehicular

Tabla De Contenido

1. Información General Y Control De Versiones 3
1.1 Ficha Técnica Del Despliegue 3
1.2 Historial De Versiones Del Documento 5
1.3 Resumen De Cambios (Release Notes) 5
2. Alcance, Topología Y Arquitectura 14
2.1 Componentes Y Artefactos En Alcance 14
2.2 Diagrama De Arquitectura De Red E Infraestructura 15
2.3 Matriz De Ambientes, Direccionamiento IP Y Puertos 16
3. Requisitos Previos Y Preparación (Pre-Deployment) 17
3.1 Checklist De Prerrequisitos Del Sistema Operativo Y VPS 17
3.2 Estrategia Y Ejecución De Respaldos (Backups) 17
3.3 Gestión De Variables De Entorno Y Secretos 19
3.4 Protocolo De Comunicación Y Ventana De Mantenimiento 21
4. Procedimiento De Despliegue Paso a Paso (Runbook) 23
4.1 Verificación Y Acceso a La Plataforma Base (Portainer CE) 23
4.2 Despliegue Y Migración De Base De Datos 23
4.3 Despliegue Y Orquestación Del Stack De Aplicación 24
4.4 Configuración De Enrutamiento, Dominio Y Certificados SSL/TLS 27
5. Plan De Verificación, Pruebas Y Evidencias (Smoke Tests) 27
5.1 Matriz De Enlaces Y Endpoints De Verificación De Servicios 27
5.2 Pruebas De Humo Funcionales (Smoke Tests) 28
5.3 Inspección De Logs Y Monitoreo De Recursos 29
5.4 Registro De Evidencias Visuales (Screenshots) 30

1. Información General y Control de Versiones
2. Alcance, Topología y Arquitectura
3. Requisitos Previos y Preparación (Pre-deployment)
4. Procedimiento de Despliegue Paso a Paso (Runbook)
5. Plan de Verificación, Pruebas y Evidencias (Smoke Tests)

1. Información General Y Control De Versiones

1.1 Ficha Técnica Del Despliegue

1.1.1 Identificación Del Sistema Y Versión (Release Tag)

Campo	Valor
Sistema	LavaRápido Vehicular — gestión de reservas, pagos y operación de un lavadero
Componentes	6 microservicios backend, API Gateway, aplicación web, aplicación móvil Android
Versión (Release Tag)	Al 27-10-2026: `v1.1.0` en api-gateway, security, operations y notification; `v1.1.1` en customer y booking, y `v1.1.2` en la web, payment-service, infra y la app móvil (esta última solo con un texto corregido, que llegó a los celulares por internet). Todas están en `main`, protegida en los 10 repositorios (PR con una aprobación de otro integrante y el CI en verde). Antes: `v1.0.0` (23-10-2026 en 8 repositorios y 24-10-2026 en payment-service), `v1.1.0` en los 10 y `v1.1.1` en la web, la app móvil, payment-service e infra el 26-10-2026 (1.3.12), y `v1.1.1` en customer y booking y `v1.1.2` en la web, payment-service e infra el 27-10-2026 (1.3.13)
Rama desplegada	`main` en los 9 repositorios del servidor desde el 26-10-2026, payment-service incluido (desde `v1.1.1` de infra ya no está en `DEVELOP_ONLY`). El despliegue continuo actualiza el servidor con cada fusión aprobada a `main` (4.3.4); las últimas corridas, del 27-10-2026, están en 1.3.13
Versión de la app móvil	**1.1.1** (versionCode **6**), APK publicado el 26-10-2026 a las 22:39 + actualizaciones por internet (EAS Update); la última, la de `v1.1.2` del 27-10-2026 a las 14:30 (1.3.13)
Repositorios	`lavarapido-infra`, `lavarapido-api-gateway`, `lavarapido-security-service`, `lavarapido-customer-service`, `lavarapido-booking-service`, `lavarapido-operation-service`, `lavarapido-notification-service`, `lavarapido-payment-service`, `Front-end-proyecto-web`, `LavadoVehicular-Movil`
Dirección pública	https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com

1.1.2 Fecha, Hora Y Ventana Operativa Programada

Campo	Valor
Fecha del despliegue inicial	16 de octubre de 2026
Ventana operativa	02:30 – 05:30 (hora de Colombia, UTC-5)
Duración real	~2 h 30 min (aprovisionamiento, compilación de imágenes, configuración de HTTPS y pruebas)
Interrupción a usuarios	No aplica: primer despliegue (no había usuarios en producción)
Ventana para próximas actualizaciones	Fuera de horario de atención del lavadero (antes de las 07:00 o después de las 18:00)
Última actualización	27-10-2026, por despliegue continuo (1.3.13): a la 01:03 (hora de Colombia) la web `v1.1.2`, y entre la 01:35 y la 01:37 customer y booking `v1.1.1` y payment-service e infra `v1.1.2`; todas las corridas que terminaron quedaron en verde, con los servicios sanos y la web y la API respondiendo 200. A las 14:30 la app móvil `v1.1.2` llegó a los celulares por internet. Antes, el 26-10-2026 en la noche: `v1.1.0` y `v1.1.1` y la primera corrida del despliegue continuo (1.3.12). Antes, el 26-10-2026 hacia las 12:02 (hora de Colombia): booking-service, payment-service y la web desde `develop`, con el pago al reservar, la migración 049 y la semilla 117 de booking (1.3.11); servicios sanos y 0 errores. Antes, el 24-10-2026 a las 17:12 UTC: solo notification-service, con la migración 048, que corrige la lectura de `pending_delivery` (1.3.10). Antes, ese mismo día hacia las 15:10: `develop` completo de los 10 repositorios (arreglos del 23-10 y del 24-10, 1.3.8 y 1.3.9), en dos corridas por SSH; 11 contenedores sanos, migraciones 044, 045 y semilla 113 (booking), 047 y semilla 116 (notification) y 022 y 023 (payment) aplicadas, y 0 errores en los registros. La actualización anterior (22-10-2026) está en 1.3.7

1.1.3 Entorno De Destino (VPS / Staging / Producción)

Campo	Valor
Entorno	**Producción académica** (también usado como staging para las pruebas del equipo)
Proveedor	Microsoft Azure (suscripción *Azure for Students*)
Tipo	Máquina virtual Linux (IaaS) equivalente a un VPS
Región	North Central US
Entorno alterno	Ninguno: el VPS de Hostinger se descartó el 21-10-2026 porque el pago no se aprobó; la producción queda solo en Azure

1.1.4 Matriz De Roles Y Responsables (DevOps, Tech Lead, QA, DBA)

> Responsables según los servicios que cada integrante mantiene en GitHub (dueño de cada repositorio). Los roles QA y DBA no tienen una persona fija: los asigna el líder de proyecto y, mientras tanto, los cubre quien se indica.

Rol	Responsable	Responsabilidades en el despliegue
DevOps	Brayan Cabrera	Servidor, Docker Compose, Caddy/HTTPS, scripts de despliegue y actualización
Tech Lead	Brayan Cabrera	Aprobación del release, revisión de cambios, coordinación del equipo
QA	Sin persona fija (la asigna Brayan Cabrera); mientras tanto, cada dueño prueba lo suyo y el DevOps corre la sección 5	Pruebas de humo y validación funcional por rol (cliente, operario, administrador)
DBA	Sin persona fija (la asigna Brayan Cabrera); mientras tanto, el DevOps con los scripts de la sección 3.2	Migraciones, respaldos y verificación de la base de datos
Responsable booking-service y customer-service	Camilo Guilombo	Cambios y verificación de sus servicios
Responsable payment-service y app móvil	Merari Urbano Quintero	Cambios y verificación de pagos y de la app

1.2 Historial De Versiones Del Documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-10-16	Brayan Cabrera	Versión inicial: despliegue en Azure
1.1	2026-10-16	Brayan Cabrera	Portainer CE instalado, evidencias reales (5.4) y corrección de esquemas y tablas de Liquibase
1.2	2026-10-16	Juan Camilo Guilombo	Conteo de tablas corregido (57) y creación del primer administrador con las variables de entorno
1.3	2026-10-19	Juan Camilo Guilombo	Actualización del 19-10-2026 (migración 039 y app 1.1.0), acceso SSH con llave propia por integrante, despliegue desde GitHub Actions, integración continua en los 10 repositorios y evidencias nuevas de terminal y de la web
1.4	2026-10-20	Equipo de desarrollo	Diagrama de topología: customer-service también se conecta a RabbitMQ (consume `security.user_registered` para crear el perfil del cliente)
1.5	2026-10-21	Brayan Cabrera	Respaldos automáticos verificados (3.2), encabezados de seguridad y CSP (2.2.3 y 5.2.4), chequeos de salud y registros limitados en todos los contenedores, modelo de recuperación `SIMPLE`, actualización del 21-10-2026 (1.3.6), cambios del código del 21-10-2026 pendientes de desplegar (1.3.7) y retiro del VPS de Hostinger
1.6	2026-10-21	Equipo de desarrollo	Cambios de la noche del 21-10-2026 en 1.3.7: las reservas confirmadas con operario que nadie registró ya no se cierran solas como "No asistió" y pasan a "Por cerrar", migraciones 040 (operations) y 041 (notification), variables `FOLLOW_UP_*`, arreglo de los campos `null` en los eventos de notification-service y ajustes de la app móvil
1.8	2026-10-24	Equipo de desarrollo	Despliegue del 24-10-2026 con `develop` (1.1.1, 1.1.2 y 1.3.9): dos corridas, espera de salud, imágenes `:prev`, `rollback.sh` y la protección que impide bajar de versión; la web en el puerto 8080 (2.2.3); variables nuevas `AUTH_RATE_LIMIT_*`, `TRUSTED_PROXIES`, `ROUTE_*_TIMEOUT`, `START_LATE_LIMIT`, e `INTERNAL_API_KEY` y `BOOKING_SERVICE_URL` en customer-service (3.3.2); reversión con `rollback.sh` y restauración con `payment-migrate` (3.2.4 y 3.4); despliegue continuo fusionado en `develop`, sin secretos (4.3.4); OTA del móvil con `cd.yml`; CI del 24-10-2026 (4.3.3)
1.7	2026-10-23	Equipo de desarrollo	Versión `v1.0.0` en 8 repositorios y pendientes de payment y móvil (1.1.1); despliegue del 22-10-2026 (1.3.7); arreglos del 23-10-2026 en `develop` para `v1.1.0` (1.3.8); las variables que el compose ya pasa, `FOLLOW_UP_LOOK_BACK_DAYS` y `ALLOWED_EMAIL_DOMAINS` (3.3.2); reversión que funciona (3.4); `setup-server.sh` desde `main` (4.3.1); despliegue continuo preparado y todavía sin probar en vivo (4.3.4); responsables de QA y DBA (1.1.4). Incluye el contenido de las ramas `fix/A-06`, `fix/A-07` y `fix/A-08` de Merari Urbano
1.9	2026-10-24	Equipo de desarrollo	Actualización de notification-service del 24-10-2026 a las 17:12 UTC con la migración 048 y su resultado (1.3.10); última actualización (1.1.2)
1.10	2026-10-26	Equipo de desarrollo	Despliegue del pago al reservar del 26-10-2026 hacia las 12:02 (hora de Colombia): booking-service, payment-service y la web, con sus verificaciones (1.3.11); variables nuevas de booking-service y `INTERNAL_API_KEY` obligatoria en payment-service (3.3.2); última actualización (1.1.2)
1.11	2026-10-26	Equipo de desarrollo	Versiones *v1.1.0* y *v1.1.1*, payment-service desde `main`, primera corrida del despliegue continuo y del APK *versionCode* 6 con la actualización por internet, y arreglos de SonarCloud (1.3.12 y 4.3.4).
1.12	2026-10-27	Equipo de desarrollo	Versiones *v1.1.1* y *v1.1.2* del 27-10-2026 y sus despliegues automáticos (1.1.1, 1.1.2 y 1.3.13); 58 tablas (2.1.4 y 5.4.5); integración continua con 1 337 pruebas y las de integración de payment contra SQL Server (4.3.3); se quitan del despliegue continuo dos avisos que ya no aplican (4.3.4).
1.13	2026-10-27	Equipo de desarrollo	Release *v1.1.3* de payment-service aprobado y pendiente de publicar, con lo que exige en producción (1.3.14).

1.3 Resumen De Cambios (Release Notes)

1.3.1 Nuevas Funcionalidades

Plataforma y despliegue

- Despliegue completo con Docker Compose y archivo de producción (`docker-compose.prod.yml`).
- HTTPS automático con Caddy y certificado de Let's Encrypt (renovación automática).
- Creación del primer administrador al instalar sobre una base vacía (`ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD`).

- Script de instalación del servidor (`setup-server.sh`) y de actualización en un paso (`update-server.sh`).
- Descarga de la app Android desde la web (botón y código QR) con dirección fija `/app/LavaRapidoVehicular.apk`.

Notificaciones

- Notificaciones push en la app móvil (Expo + Firebase) implementadas con el patrón Command.
- Entrega por canales (push y correo) con aislamiento de fallos.
- Avisos en el idioma de la cuenta (español, inglés, francés y portugués).
- Aviso a los administradores de reservas próximas sin operario.
- Aviso de versión nueva de la app por push y por bandeja.
- La campanita de la web se actualiza sola y muestra un aviso flotante con las notificaciones nuevas.

Reservas y operación

- Asignación automática de operario al confirmarse una reserva (RF-008).
- El cliente puede elegir el operario entre los disponibles (RF-010).
- El operario solo puede iniciar el servicio desde 15 minutos antes de la reserva.
- Reporte de inspección del vehículo con fases, hallazgos y fotos, compartido con el cliente.
- Resumen del día y métricas del equipo de operarios para el administrador.

Pagos y cuentas

- Historial de pagos ordenado y filtrable por fecha y servicio (RF-015/016).
- Bloqueo de la cuenta por 15 minutos tras 5 intentos de inicio de sesión fallidos (RF-004b).
- Datos del negocio editables por el administrador y dirección del perfil guardada en el backend.

App móvil

- Aviso de versión nueva y actualizaciones por internet (EAS Update) sin reinstalar.
- Ícono con el logo del proyecto y nombre "LavaRapidoVehicular".

1.3.2 Correcciones De Errores (Bug Fixes)

- Un pago aprobado se mostraba como "en verificación" en la pantalla de pagos (web y móvil).
- La web desplegada recibía 403 en todas las llamadas por la configuración de CORS de los servicios.
- security-service no arrancaba cuando ya existía un administrador (consulta fuera de transacción).
- La lista de operarios de la app no mostraba un operario recién creado hasta cerrar sesión.
- Un 401 tardío después de cerrar sesión mostraba el aviso de "sesión vencida".
- El anuncio de un APK nuevo no podía leer la llave entre servicios por permisos de archivo.
- Los recordatorios pendientes se seguían enviando después de iniciar o terminar el servicio.
- No se asigna operario a reservas cuya hora ya pasó, ni se listan reservas canceladas como pendientes.
- La web pedía un `favicon.ico` inexistente (error 404 en consola) y usaba opciones obsoletas de traducción (advertencia en consola).

1.3.3 Cambios De Infraestructura Y Dependencias

Cambio	Detalle
Imágenes Docker	Java: `eclipse-temurin:21-jdk` (compilación) y `21-jre` (ejecución) · .NET: `dotnet/sdk:8.0` y `aspnet:8.0` · Web: `node:22-alpine` y `nginx:1.27-alpine`
Servicios de infraestructura	`mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest` (Express), `rabbitmq:4-management`, `caddy:2-alpine`, `liquibase/liquibase:4.29`
Migraciones nuevas	032 (datos del negocio), 033 (reporte de inspección), 034 (bloqueo de login), 035 (dirección), 036 (fecha de registro), 037 (perfil del operario), 038 (tipo de aviso de versión nueva) y 039 (aceptación de los documentos legales, aplicada el 19-10-2026)
Dependencias web	`qrcode` 1.5.4
Dependencias móviles	`expo-notifications`, `expo-device`, `expo-build-properties`, `expo-updates`, `expo-application`
Servicios externos	Expo Push + Firebase Cloud Messaging (push), Gmail SMTP (correo), EAS (compilación y actualizaciones de la app)
Operación del servidor (20 y 21-10-2026)	Respaldos automáticos con verificación (`backup-db.sh`, `verify-backup.sh`, `restore-db.sh`), base en modelo de recuperación `SIMPLE`, chequeo de salud cada 30 s en los 11 contenedores, registros de cada contenedor limitados a 3 archivos de 10 MB, y encabezados de seguridad con CSP en Caddy

1.3.4 Cambios Incompatibles (Breaking Changes)

- **Variables obligatorias nuevas** en el servidor. Sin ellas, Docker Compose no arranca:
- `INTERNAL_API_KEY`, `PUBLIC_URL`, `RABBITMQ_USERNAME` y `RABBITMQ_PASSWORD`;
- `RABBITMQ_*` no puede ser `guest/guest`.
- **Primer administrador:** las cuentas demo (`admin@gmail.com`, etc.) **solo existen en desarrollo**. En producción el administrador se crea con `ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD`.
- **App móvil:** el paquete Android cambió a `com.vehiclecarwash.app`. Las versiones anteriores se deben desinstalar una vez; las siguientes se instalan encima.
- **CORS:** cada servicio solo acepta el origen definido en `PUBLIC_URL`.

1.3.5 Actualización Del 19-10-2026

El 19-10-2026 a las 03:20 (hora del servidor) se corrió `update-server.sh`. Quedaron desplegados los cambios de `develop` hasta el 17 y 18 de octubre:

- **Base de datos:** migración 039, que guarda la fecha y la hora en que cada persona acepta los Términos y la Política de Tratamiento de Datos.
- **Backend:** la salud de payment-service consulta la base de datos, payment-service maneja el identificador de correlación, el error de horario trae el motivo (`reason`), dos solicitudes simultáneas ya no fallan al crear el mismo operario y no se puede crear una bahía en mantenimiento.
- **Web:** la pantalla de pagos selecciona por cuenta, la opción del perfil se llama "Desactivar mi cuenta", Angular quedó en 21.2.25 y xlsx en 0.20.3, y hay ajustes de diseño para celular.
- **App móvil:** versión 1.1.0 (versionCode 5), publicada el 19-10-2026 a las 05:03, con la versión visible en Configuración.

Quedan para la próxima actualización los cambios subidos después: los mensajes de error con `spring.web.error` en los servicios Java y los últimos ajustes de la web y de la app.

1.3.6 Actualización Del 21-10-2026

El 21-10-2026 a las 05:21 (hora del servidor) se reconstruyeron las imágenes con el código de `develop` del 20 de octubre y la infraestructura nueva de `lavarapido-infra`. Antes se tomó un respaldo de la base.

- **Infraestructura:** respaldos automáticos verificados (3.2); base en modelo de recuperación `SIMPLE`; chequeo de salud cada 30 segundos en los 11 contenedores, incluido Caddy (`docker compose ps` los muestra `healthy`); registros limitados a 3 archivos de 10 MB por contenedor; encabezados de seguridad y política de contenido (CSP) en Caddy (5.2.4).
- **Backend y web:** los cambios que quedaron pendientes el 19-10 (mensajes de error con `spring.web.error` y ajustes de la web) y los del 19 y 20 de octubre: se retiró el cambio de rol de una cuenta, los datos de ejemplo del negocio se borran para que el negocio real los complete (semilla 111 de booking-service) y la web abre el detalle de cada reserva y aviso.

1.3.7 Cambios Del 21-10-2026 (Desplegados El 22-10-2026)

Estaban en `develop` desde el 21-10-2026 y entraron al servidor el 22-10-2026 con `update-server.sh`; quedaron aplicadas la semilla 112 y las migraciones 040 y 041, y ese día se generaron los respaldos `LavaRapido-20261022-081543.bak.gz` y `LavaRapido-20261022-173855.bak.gz` (este último, al volver a desplegar operations-service a las 12:38):

- **security-service y api-gateway:** el token de una sesión cerrada (logout, cuenta inhabilitada o desactivada) deja de servir; el gateway lo confirma con `GET /api/v1/auth/session` y guarda la respuesta 30 segundos por token.
- **booking-service:** cada 5 minutos se cancela, con el motivo del sistema `EXPIRED` ("Venció sin confirmarse"), la reserva programada que siguió sin confirmarse una hora después de su fin; la semilla 112 agrega ese motivo, y booking-service la aplica al arrancar. La ruta interna `POST /internal/v1/bookings/{id}/no-show` deja en "No asistió" una reserva confirmada vencida, solo cuando la pide operations-service (409 `BOOKING_NOT_EXPIRED` si todavía no vence).
- **operations-service:** la asignación manual y la automática usan el mismo candado, y `GET /api/v1/admin/assignments/unassigned` da el conteo único de reservas sin operario, que ahora usan la web y la app móvil. Cada 5 minutos, `FollowUpJob` deja en "No asistió" la reserva confirmada que nunca tuvo operario y terminó hace más de una hora; la que tenía operario y nadie inició o finalizó nunca se marca sola: pasa a la lista "Por cerrar" del administrador (`GET /api/v1/admin/assignments/to-close` y `POST /api/v1/admin/assignments/{bookingId}/attended`), con un solo aviso al operario y a los administradores. La migración 040 agrega `execution.service_execution.follow_up_notice_at`.
- **notification-service:** avisos `OPERATOR_SERVICE_NOT_REGISTERED` y `ADMIN_SERVICE_NOT_REGISTERED` (bandeja y push, migración 041), y un campo `null` en el payload de un evento ya no manda el mensaje a la cola de errores (DLQ).
- **payment-service:** comprobantes de máximo 2 MB (`RECEIPT_TOO_LARGE`) y la cuenta de efectivo en la lista del cliente solo mientras está activa.
- **Web:** sesión sincronizada entre pestañas, comprobante comprimido, lupa para el QR, reportes que cuentan solo reservas completadas, textos de la pestaña de roles y tarjeta "Por cerrar" en el inicio del administrador.
- **App móvil:** comprobante comprimido, lupa para el QR, pantalla de actualización obligatoria del APK, tarjeta "Por cerrar" y conteo de reservas sin asignar con la regla de operations-service; el formulario de reserva del administrador guarda el operario y el estado elegidos, la barra de puntos del cliente queda completa cuando no queda nada por

desbloquear y no muestra "0% OFF", el operario ve "—" cuando no tiene calificaciones, la pestaña de roles indica que los 3 roles son fijos y los avisos nuevos abren la pantalla de servicios del operario o el inicio del administrador. No agregan dependencias nativas, así que llegan con `npm run publish:update`.

Las variables nuevas (`SESSION_CHECK_*`, `BOOKING_EXPIRY_*` y `FOLLOW_UP_*`, nueve en total, incluida `FOLLOW_UP_LOOK_BACK_DAYS`) tienen valor por defecto, están comentadas en `.env.example` y `.env.production.example`, y `docker-compose.yml` las pasa a los contenedores desde el 22-10-2026 (commit `70b990c` de `lavarapido-infra`): solo se escriben en `.env.production` para cambiar su valor. `FOLLOW_UP_*` necesita `INTERNAL_API_KEY`, que ya está en `.env.production`.

1.3.8 Versión v1.0.0 Y Arreglos Del 23-10-2026 (Desplegados El 24-10-2026)

El 23-10-2026 se pasó `develop` a `main` y se etiquetó `v1.0.0` en 8 repositorios. payment-service y la app móvil no tienen todavía esa versión: el PR #2 de payment está abierto, sin revisión y con el *quality gate* de SonarCloud en error por cuatro falsos positivos, y la app no tiene PR. Ese mismo día, después de la etiqueta, entraron a `develop` estos arreglos de la auditoría del 22-10-2026, que saldrán en `v1.1.0` (CI verde en los 10 repositorios):

- **api-gateway:** deja de publicar `/api/v1/operator/bookings/**` (E-01).
- **booking-service:** las rutas del operario solo aceptan a operations-service con la llave interna y aplican la regla de los 15 minutos (E-01); el administrador elige el motivo de la cancelación (A-20); un cambio de estado hecho por el administrador publica un evento para el cliente (A-11); los puntos de fidelización quedan congelados en cada línea de la reserva (A-09, migración 043).
- **operations-service:** envía la llave interna a booking-service (E-01), guarda las notas de la asignación (B-01, migración 042) y revisa que la cuenta del operario siga activa al asignar y al reprogramar (A-13, E-12).
- **security-service:** valida en el servidor los dominios de correo permitidos (`ALLOWED_EMAIL_DOMAINS`, por defecto `gmail.com`, A-01); el token que todavía dice un rol que la cuenta ya no tiene deja de servir y sus sesiones se revocan (E-02); ya no arranca en perfil `dev` por defecto ni guarda contraseñas demo en el código (E-05).
- **customer-service:** rechaza las placas de más de 6 caracteres en lugar de recortarlas (E-16).
- **notification-service:** avisa al cliente cuando el administrador cambia el estado de su reserva (A-11).
- **payment-service:** el descuento porcentual va de 1 a 99 % y siempre queda un monto por pagar (E-07); quitar el cupón anula el canje en el servidor (`DELETE /api/v1/loyalty/redemptions/{bookingId}/{promotionId}`) y solo se permite una promoción por reserva (migración 021, E-08 y E-09); sin contraseña por defecto en su base aislada (E-05).
- **Web:** E-07, E-08 y A-01 como arriba; reasignar el operario (A-02), notas al asignar (B-01), motivo de cancelación (A-20), datos reales en el historial y los servicios del operario (A-18), ingresos por fecha de aprobación y estado "En servicio" (A-17, A-19), mensaje de cuenta de operario desactivada (A-13) y pruebas del guard, el interceptor y varios ViewModels (F-02).
- **App móvil:** E-07, E-08, A-01 y A-13, y las primeras pruebas automáticas con `jest-expo` en el CI (F-01). Son cambios de JavaScript: llegan a los APK instalados con `npm run publish:update`.
- **lavarapido-infra:** `ALLOWED_EMAIL_DOMAINS` y `DEMO_ADMIN_PASSWORD`, `DEMO_OPERATOR_PASSWORD` y `DEMO_CLIENT_PASSWORD` (solo perfil `dev`) en el compose y en `.env.example`, sin contraseñas reales versionadas (E-05), e `INTERNAL_API_KEY` documentada como obligatoria para que el operario inicie y termine servicios (E-01).

Antes de desplegarlos: `INTERNAL_API_KEY` ya está en `.env.production`, así que el cambio E-01 no pide nada nuevo; las cuentas demo no existen en producción; y la migración 021 de payment tiene la precondición `onFail: CONTINUE`: si la base ya tiene una reserva con dos cupones canjeados, el índice único no se crea y no avisa, así que conviene revisarlo en la base antes de actualizar. También conviene consultar si hay cuentas con un correo que no sea @gmail.com (la web y la app ya no las dejan iniciar sesión) y placas de más de 6 caracteres en `customer.customer_vehicle` (customer-service ya no puede leer ese vehículo). SEC-01, BIZ-01, BIZ-02 y OPS-01, que seguían abiertos ese día, se corrigieron el 24-10-2026 (1.3.9). Desde que el inicio de sesión acepta cualquier dominio (A-01, 1.3.9), la consulta de cuentas con otro dominio ya no hace falta.

1.3.9 Correcciones Del 24-10-2026 (Desplegadas Ese Día)

El 24-10-2026 se fusionaron a `develop` 128 ramas de correcciones de los 10 repositorios (autor brayan, sin coautores, `--no-ff`). Antes de subir cada repositorio, sus ramas se fusionaron sobre `develop` en una copia aparte, se corrió la suite completa y se comprobó que lo subido fuera idéntico a lo probado. El CI de `develop` quedó en verde en los 10 (1 192 pruebas). Lo principal:

- **api-gateway:** revisa la sesión con cualquier esquema del encabezado (SEC-01); 60 peticiones por minuto por IP en `/api/v1/auth/**`, con 429 `RATE_LIMITED` y `Retry-After`, tomando la IP real del cliente solo de los proxies de confianza (SEC-04, SEC-11); 5 s para conectar y 60 s para leer en cada ruta (SEC-16).
- **security-service:** consentimiento obligatorio al registrar (SEC-07); 5 intentos para el código de recuperación y para la contraseña actual (423 `TOO_MANY_ATTEMPTS`, SEC-05, SEC-12); tiempo parejo con correos que no existen (SEC-04); contraseñas de hasta 72 bytes (SEC-11).
- **booking-service:** el cliente solo cambia la fecha y la hora (BIZ-01); precio mayor que 0 (BIZ-04, migración 044); bloqueo optimista de la reserva (BIZ-09, migración 045); cambios de horario o de bahías que chocan con reservas responden 409 (BIZ-10); rutas `/bookings/**` solo para clientes (BIZ-12); se quitó la tarea que vencía reservas (B-07); la semilla 113 borra los datos de ejemplo de la sede (E-19).
- **customer-service:** no deja retirar un vehículo con reservas activas (BIZ-08; llama a booking-service con `BOOKING_SERVICE_URL` e `INTERNAL_API_KEY`); rutas `/vehicles/**` solo para clientes (BIZ-12); lee las placas largas ya guardadas (E-16).
- **operations-service:** iniciar y terminar no dejan bloqueado al operario (OPS-01, OPS-03, OPS-11); reintentos y cola de errores `operations-service.booking-confirmed.dlq` (OPS-04; la cola vieja `operations-service.events` se vacía y se borra sola al arrancar); se puede iniciar hasta 4 horas después de la hora de fin (A-12, `START_LATE_LIMIT`); el operario ve las notas (B-01).
- **notification-service:** entregas pendientes con reintento (OPS-05, migración 047); los cambios de estado del administrador cancelan los recordatorios y el NO_SHOW tiene su aviso (A-11, semilla 116); aviso al operario y a los administradores cuando una reserva queda sin operario (E-12).
- **payment-service:** monto y cupón del cliente (`GET /loyalty/redemptions/{bookingId}`, BIZ-02); 409 `AMOUNT_CHANGED` al aprobar un monto viejo (BIZ-01); cupón de porcentaje con el total vigente (BIZ-05, migración 022); un solo pago abierto y referencia única (A-16, migración 023); cola paginada del administrador (E-10); aviso de reserva cancelada (BIZ-07); efectivo inactivo para el administrador (C-04); SonarCloud en verde.

- **Web:** monto del servidor y cupón que sobrevive a una recarga; datos frescos sin recargar (al entrar, al volver a la pestaña, con cada notificación y cada 45 s en las pantallas que esperan a otra persona); los 216 códigos de error traducidos; matriz de permisos de solo lectura (H-05); login con cualquier dominio y registro solo con gmail.com (A-01); notas y ventana de inicio del operario; nginx sin `root` en el puerto **8080** (H-19).
- **App móvil:** lo mismo que la web en el pago, el refresco (al volver a la pantalla y con cada push), los errores y el operario, más la URL HTTPS en el perfil `production` (MOV-08), la cola de pagos paginada y `cd.yml` para publicar la actualización por internet (OTA) al llegar a `main`.
- **lavarapido-infra:** despliegue continuo (4.3.4), imágenes `:prev` y `rollback.sh`, limpieza de imágenes y retención de respaldos, `restore-db.sh` con candado y `payment-migrate`, arreglo del usuario del `cron` de respaldos, Caddy apuntando a `web:8080`, la batería e2e remota (`e2e.yml`) y la protección que impide bajar de versión (`setup-server.sh`, commit `d5d6909`).

Cómo se desplegó (24-10-2026, hacia las 15:10). Por SSH, en dos corridas seguidas:

1. **Primera corrida**, con los scripts que tenía el servidor: bajó `develop`, respaldó la base, reconstruyó y aplicó las migraciones. Como esos scripts viejos no reinician Caddy, la web nueva (que ya escucha en 8080) habría quedado detrás de un Caddy que todavía apuntaba a `web:80`; por eso se lanzó enseguida la segunda.
2. **Segunda corrida**, con `BRANCH=develop` y los scripts nuevos que trajo la primera: guardó la versión que corría como `:prev` (8 imágenes), reinició Caddy porque el `Caddyfile` cambió, esperó hasta 8 minutos a que los 11 contenedores quedaran sanos, escribió `backups/deployed-heads` e instaló la tarea `@reboot` de `boot-update.sh`.

Resultado: 11 contenedores `healthy`; migraciones y semillas 044, 045, 113, 047, 116, 022 y 023 aplicadas; colas `operations-service.booking-confirmed` y su `.dlq` creadas; 8 imágenes `:prev`; 0 errores en los registros y las rutas de la web y la API respondiendo. **Hasta liberar `v1.1.0`**, toda actualización a mano se hace con `BRANCH=develop bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/update-server.sh`. Al encender la máquina, `boot-update.sh` baja `main` por defecto y la protección lo detiene sin tocar nada (queda anotado en `backups/deploy.log`): el servidor sigue con lo que tenía.

Antes de liberar `v1.1.0`, en la base de producción: buscar los pagos abiertos duplicados que rechazó la migración 023 (`rejection_reason LIKE 'Pago duplicado%'`) y contar las reservas COMPLETED con líneas abiertas (generan avisos falsos de "no se inició", ACO-35). Quedan abiertas en el documento de Acciones Correctivas, Tabla 7, ACO-33 a ACO-40, entre ellas la cola de pagos de la web sin paginar (ACO-33).

1.3.10 Actualización De notification-service Del 24-10-2026 (17:12 UTC)

Al probar producción después del despliegue de las 15:10 (1.3.9) se vio que notification-service no podía leer la tabla nueva `notification.pending_delivery` (migración 047): `channel` y `language` eran `VARCHAR`, Hibernate las lee como `NCHAR` (`use_nationalized_character_data: true`) y el controlador de SQL Server no admite esa conversión. Desde el despliegue no salía ninguna push ni ningún correo de notification-service (bienvenida, reservas, pagos y recordatorios); la bandeja de avisos y el correo de recuperación de contraseña (lo envía security-service) sí funcionaban. Quedaron 2 entregas atascadas: 1 push y 1 correo de bienvenida.

- **Corrección:** migración `048-notification-pending-delivery-nvarchar.sql` (commit `612417a`, merge a `develop` `3f99df4`): `channel` NVARCHAR(10) NOT NULL y `language` NVARCHAR(5) NULL, con

uq_pending_delivery_channel y ck_pending_delivery_channel recreados; precondición MARK_RAN y rollback. Antes se probó en tempdb con los datos conservados, y la suite de notification pasó.

- **Despliegue:** solo notification-service, el 24-10-2026 a las 17:12 UTC.
- **Resultado:** migración 048 aplicada; las 2 entregas atascadas salieron a las 17:13:50 (push) y a las 17:13:52 (correo), y desde entonces no hay errores. Queda registrada como AC-87 en el documento de Acciones Correctivas.

1.3.11 Pago Al Reservar: Despliegue Del 26-10-2026 (Hacia Las 12:02, Hora De Colombia)

Para que nadie bloquee la agenda con reservas que no piensa pagar (pregunta de la preparación de la sustentación y recomendación del instructor), al reservar el cliente elige cómo va a pagar: en efectivo puede tener como máximo 1 reserva activa (409 CASH_BOOKING_LIMIT) y una reserva con pago digital sin comprobante se cancela sola a los 30 minutos, o a la hora de inicio si es más pronto, con el motivo PAYMENT_TIMEOUT (AC-88 y AC-89 del documento de Acciones Correctivas). Lo que se desplegó:

- **booking-service** (develop db156cb): paymentMode en POST /api/v1/bookings (400 INVALID_PAYMENT_MODE); paymentMode, paymentDeadline y paymentReported en las vistas de reserva; migración 049-booking-payment-mode-deadline.sql (payment_mode NVARCHAR(10), payment_deadline, payment_reported_at y el índice filtrado ix_booking_payment_pending; precondición MARK_RAN y rollback) y semilla 117-seed-payment-timeout-cancellation-reason.sql (motivo PAYMENT_TIMEOUT); cola booking.payment-events (con su .dlq) unida a carwash.events con payment.reported y payment.confirmed; tarea PaymentDeadlineJob, que antes de cancelar le pregunta a payment-service. Numeración global después del cambio: estructura máx. 049 (siguiente 050), semillas máx. 117 (siguiente 118); payment sigue en 023.
- **payment-service** (develop d94cde5): evento payment.reported al reportar un pago con comprobante y ruta interna GET /internal/v1/payments/bookings/{bookingId}/reported, que exige X-Internal-Key (401 sin llave o con una errada). Hasta ahora payment no validaba ninguna llave interna.
- **Web** (develop 7f8aca5): paso 4 "¿Cómo vas a pagar?", plazo y etiqueta de efectivo en el historial, pantalla de pago según el modo, forma de pago en el detalle del administrador y Términos y Condiciones del 26-10-2026.
- **lavarapido-infra** (develop 0f949e5): las variables de booking y la llave interna de payment en el compose (3.3.2).
- **App móvil** (develop acf4e6d): el mismo cambio, por OTA; todavía no llega a los celulares, porque la OTA sale al fusionar a main (*v1.1.0*) y falta el EXPO_TOKEN.

Cómo se desplegó. Con BRANCH=develop y el script de actualización del servidor (update-server.sh, sección 4.3.3) se desplegaron booking-service, payment-service y la web, y al arrancar booking-service se aplicaron la migración 049 y la semilla 117. docker-compose.prod.yml exige ahora INTERNAL_API_KEY para payment-service; como ya estaba en .env.production para los demás servicios, payment arrancó sano.

Verificaciones:

- Todos los servicios quedaron healthy y hubo 0 errores en los registros.
- Las columnas nuevas de booking.booking quedaron en NVARCHAR y existe el motivo PAYMENT_TIMEOUT.
- La cola booking.payment-events tiene consumidor.
- La ruta interna de payment responde 401 sin llave y 200 reported:true con llave para una reserva con pago aprobado.
- 0 fallas al publicar eventos.

- El equipo hizo una reserva en efectivo (#12) y una con pago digital (#13, con plazo a las 13:06).

Las pruebas en vivo hechas antes en local, con las dos fallas simuladas, están en el documento de Pruebas, sección 3.4.

1.3.12 Versiones v1.1.0 Y v1.1.1 Y Primer Despliegue Continuo (26-10-2026, Noche, Hora De Colombia)

- **Versiones.** *v1.1.0* en los 10 repositorios (la app móvil tuvo así su primera versión) y *v1.1.1* en la web, la app móvil, payment-service e infra. La *v1.1.1* trae los Términos y Condiciones con la sección 6 (reservas, cancelaciones y prestación del servicio) en tercera persona y la sección 8 nueva sobre el informe de inspección y las fotografías del vehículo, y la Política de Datos con esas fotografías en los datos que se recolectan, las finalidades y la conservación (apartados 4, 5 y 12).
- **payment-service desde *main*.** Se quitó payment-service de `DEVELOP_ONLY` en `setup-server.sh` (*lavarapido-infra* `baeebad`, incluido en *v1.1.1*): ahora el servidor baja `main` en todos los repositorios.
- **Despliegue continuo.** Con los secretos creados, la fusión del PR «Release v1.1.1» a `main` de `lavarapido-infra` lanzó a las 22:19 el flujo **Desplegar en Azure** con `automatic=true`, sin entrar por SSH. Los pedidos de los demás repositorios siguieron hasta las 22:48; los que llegaron mientras otro corría se cancelaron y los atendió el siguiente. Todas las corridas que terminaron quedaron en verde: respaldo de la base, `:prev`, todos los servicios sanos («Listo: todos los servicios están sanos») y «Web y API responden 200». La corrida de las 22:19 todavía bajó payment-service de `develop`; desde la de las 22:46 lo baja de `main`.
- **App móvil.** La publicación de *v1.1.0* (13:13) falló porque faltaba el secreto `EXPO_TOKEN` y no se publicó nada. Con el secreto creado, se publicó el APK *versionCode* 6 a las 22:39 (`/app/version.json`) y la corrida de *v1.1.1* (22:41) comparó la huella nativa del commit con la del APK publicado: como coincidió («La huella coincide: la actualización le llega al APK publicado»), publicó la actualización por internet. Si la huella no coincide, el flujo no publica y pide un APK nuevo, para no mandar a los celulares una actualización que no les sirve.
- **SonarCloud.** Arreglos del 26-10-2026 en api-gateway (un acceso nulo real en la ruta de autenticación y la comparación de redes CIDR por contenido), security, operations y notification (*@Primary* en los publicadores de RabbitMQ y en los remitentes SMTP y Expo), la web y la app móvil (CI más estricto y avisos de calidad).

1.3.13 Versiones v1.1.1 Y v1.1.2 Con Despliegue Continuo (27-10-2026, Hora De Colombia)

- **Versiones.** *v1.1.2* de la web (fondos de la portada y del ingreso en WebP); *v1.1.1* de customer-service (los vehículos por id se buscan con una sola consulta de dueños) y de booking-service (400 `VALIDATION_ERROR` en lugar de 500 con una lista de servicios nula o de más de 10 y con un día inválido en el horario, horas alternativas sin las que chocan con otra reserva del mismo vehículo y `bookedBy` solo en las vistas del personal); *v1.1.2* de payment-service (las 17 pruebas de integración corren en el CI contra SQL Server 2022) y de infra (las pruebas de punta a punta envían el modo de pago al reservar). Los PR a `main` de customer, booking, payment e infra los aprobó Brayan Patiño.
- **Despliegue continuo.** Cada fusión pidió el despliegue al flujo **Desplegar en Azure**, sin entrar por SSH: la corrida de la 01:03 (la web) terminó a la 01:09 y las de la 01:35 y la 01:36 (customer, booking, payment e infra) terminaron a la 01:36 y la 01:37; un pedido que llegó mientras otro corría se canceló y lo atendió el siguiente. Todas las corridas que terminaron quedaron en verde: respaldo de la base, `:prev`, «Listo: todos los servicios están sanos» y «Web y API responden 200». El servidor corre `main`.

- **App móvil.** La fusión de *v1.1.2* (14:30), que solo cambia la nota del paso de reservar en los cuatro idiomas, corrió `cd.yml`: la huella nativa coincidió con la del APK *versionCode* 6 («La huella coincide: la actualización le llega al APK publicado») y la actualización se publicó por internet, sin APK nuevo.

1.3.14 payment-service v1.1.3: Aprobada, Pendiente De Publicar (27-10-2026)

- **Qué trae (PR #15 y release PR #16, aprobados por Brayan Patiño).** Sin contraseñas en el código: el script de punta a punta lee `DEMO_CLIENT_PASSWORD` y `DEMO_ADMIN_PASSWORD` del entorno o de `lavarapido-infra/.env`. El servicio no arranca sin `DB_PASSWORD` y, con `MESSAGING_ENABLED=true` contra un RabbitMQ remoto, tampoco sin `RABBITMQ_USERNAME` y `RABBITMQ_PASSWORD` (`guest` solo con RabbitMQ local). `.gitignore` cubre cualquier `.env.*`. La base de pruebas local pasa a SQL Server 2022 y `LavaRapidoPaymentIT`, como el CI, y el script de punta a punta vuelve a pasar (forma de pago al reservar y cuenta digital). Pruebas: 275 en el CI (dominio 142, aplicación 61, API 47 y 25 del proyecto de infraestructura, 12 de ellas contra SQL Server).
- **Producción ya cumple esas validaciones:** `docker-compose.prod.yml` exige `RABBITMQ_USERNAME` y `RABBITMQ_PASSWORD` en `.env.production` y le pasa `DB_PASSWORD` a payment; `/actuator/health` sigue respondiendo `{"status":"UP"}`. Al fusionar el PR #16 a `main`, el despliegue continuo lo publica en Azure (sección 4.3.4); antes conviene confirmar esas tres variables en el `.env.production` del servidor.
- **Pendiente de seguridad (ACO-25).** En el historial de Git de payment-service quedaron dos contraseñas antiguas de SQL Server y las de las cuentas demo; si alguna de SQL Server se usa en el servidor, hay que cambiarla.

2. Alcance, Topología Y Arquitectura

2.1 Componentes Y Artefactos En Alcance

2.1.1 Panel De Administración (Portainer CE)

> **Estado: instalado el 16-10-2026.** Panel para ver estado, logs y consumo de los contenedores y reiniciarlos. El despliegue y las actualizaciones se siguen haciendo con los scripts (sección 4.3).

Artefacto	Imagen	Acceso
Portainer CE	`portainer/portainer-ce:2.21.5` (~11 MB de RAM)	Solo por túnel SSH (`https://localhost:9443`); escucha en `127.0.0.1`, sin exponer a internet
Entorno	`local` (socket `/var/run/docker.sock`)	Stack `lavarapido` visible como *Compose · Limited* (creado fuera de Portainer)

2.1.2 Capa Frontend Web (SPA / Servidor Web Nginx)

Artefacto	Tecnología	Imagen / contenedor
Aplicación web	**Angular 21** (SPA), i18n en 4 idiomas	`lavarapido/web:local` → `lavarapido-web`
Servidor web	nginx 1.27: sirve el build y pasa `/api` al gateway	dentro de `lavarapido-web`
Proxy inverso y HTTPS	Caddy 2 (Let's Encrypt)	`lavarapido-caddy`
App móvil Android	Expo / React Native, APK compilado con EAS	Servido en `/app/LavaRapidoVehicular.apk`

2.1.3 Capa Backend API (Java Spring Boot / C# .NET Core)


Servicio	Tecnología	Puerto interno	Responsabilidad
api-gateway	Spring Cloud Gateway (Java 21)	8080	Punto de entrada único de `/api/v1`
security-service	Spring Boot (Java 21)	3001	Cuentas, login, JWT, roles, preferencias
customer-service	Spring Boot (Java 21)	3002	Clientes y vehículos
booking-service	Spring Boot (Java 21)	3003	Catálogo, horario, reservas
operations-service	Spring Boot (Java 21)	3004	Operarios, asignación, ejecución, calificaciones, inspección
payment-service	ASP.NET Core 8 (C#)	3005	Pagos, comprobantes, fidelización y promociones
notification-service	Spring Boot (Java 21)	3006	Bandeja, correo, push, recordatorios
rabbitmq	RabbitMQ 4	5672	Eventos entre servicios (exchange `carwash.events`)

2.1.4 Capa De Persistencia (SQL Server)

Artefacto	Detalle
Motor	**Microsoft SQL Server 2022, edición Express** (contenedor `lavarapido-sqlserver`)
Base de datos	`LavaRapido`: 9 esquemas y 58 tablas — `security` (11), `customer` (3), `booking` (10), `catalog` (3), `execution` (11), `notification` (7), `payment` (7), `promotion` (5), `audit` (1)
Migraciones	**Liquibase**: los servicios Java las aplican al arrancar; payment-service las aplica con el contenedor `payment-migrate`. Cada servicio lleva su historial en `dbo.DATABASECHANGELOG_<SERVICIO>`
Volúmenes persistentes	`sqlserver-data` (base), `rabbitmq-data` (colas), `caddy-data` (certificados)
Respaldos	`~/lavarapido/backups/` en el disco de la VM, fuera de Docker: los últimos 14 y la bitácora `backup.log` (3.2)

2.2 Diagrama De Arquitectura De Red E Infraestructura

2.2.1 Topología Del Servidor VPS

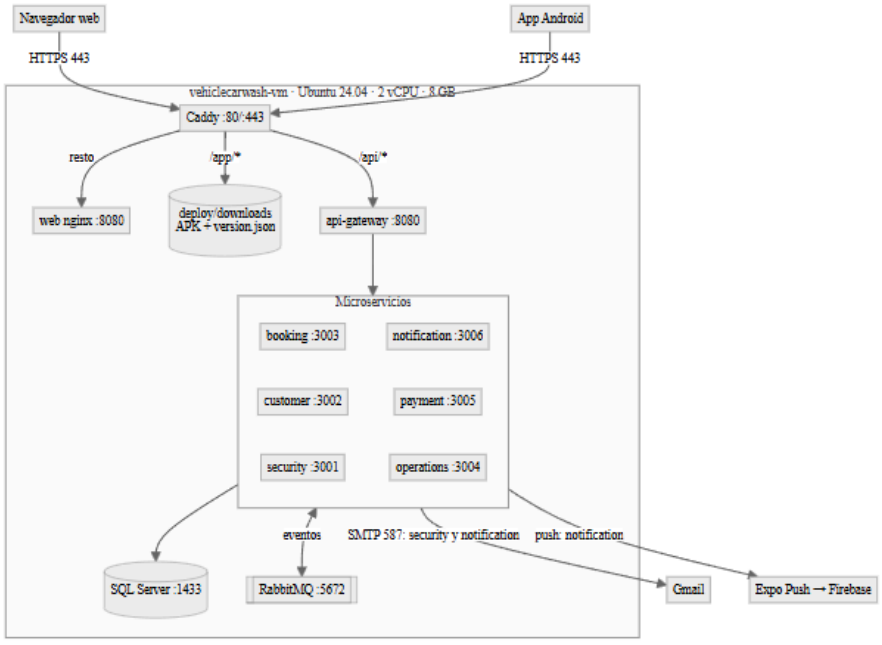

2.2.2 Red Interna De Contenedores (Docker Bridge Network)

- Todos los contenedores están en la red bridge *`lavarapido_default`*, creada por Docker Compose.

- Entre ellos se llaman por **nombre de servicio**: `sqlserver`, `rabbitmq`, `security-service`, `api-gateway`, `web`, etc. El DNS interno de Docker es `127.0.0.11`.
- Las rutas `/internal/**` (llamadas entre servicios) se protegen con la cabecera `X-Internal-Key` (`INTERNAL_API_KEY`). **El gateway no las publica.**
- Ningún puerto de la red interna se publica en la máquina, salvo los de Caddy.

2.2.3 Enrutamiento Y Reverse Proxy Con Certificados TLS/HTTPS

Ruta pública	Destino	Notas
`https://<dominio>/api/*`	`api-gateway:8080`	API REST v1 de la web y la app
`https://<dominio>/app/*`	Carpeta `deploy/downloads`	APK y `version.json` (sin caché)
`https://<dominio>/*`	`web:8080`	SPA de Angular (rutas → `index.html`). Desde el 24-10-2026 la web corre `nginx-unprivileged`, sin `root`, en el puerto 8080; su chequeo de salud también usa 8080
`http://<dominio>/*`	Redirección 308 a HTTPS	Automática (Caddy)

- **Certificado:** Let's Encrypt, emitido y renovado automáticamente por Caddy (vence el 14-01-2027 y se renueva antes). Se guarda en el volumen `caddy-data`.
- **Dominio:** etiqueta DNS de Azure en la IP pública: `lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com`.
- **Encabezados de seguridad:** desde el 20-10-2026 Caddy agrega HSTS, `nosniff`, `X-Frame-Options`, `Referrer-Policy` y `Permissions-Policy` a todas las respuestas, quita el encabezado `Server` y envía una política de contenido (CSP) con la web (5.2.4).
- **Configuración:** `lavarapido-infra/deploy/Caddyfile`.

2.3 Matriz De Ambientes, Direccionamiento IP Y Puertos

Ambiente	Host	IP / URL	Uso
Desarrollo	PC de cada integrante	`localhost` (web 4200, móvil 8081, gateway 8080)	Programación y pruebas locales (Mailpit atrapa los correos)
Producción académica	Azure VM `vehiclecarwash-vm`	IP estática `64.236.160.129` · https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com	Exposición, pruebas del equipo, app instalada

Puerto	Servicio	¿Expuesto a internet?
22	SSH (solo con llave)	Sí (administración)
80 / 443	Caddy	Sí
8080	api-gateway	No (solo red interna)
3001–3006	Microservicios	No
1433	SQL Server	No
5672 / 15672	RabbitMQ / panel	No
9443	Portainer CE	No (solo `127.0.0.1`, por túnel SSH)

3. Requisitos Previos Y Preparación (Pre-Deployment)

3.1 Checklist De Prerrequisitos Del Sistema Operativo Y VPS

3.1.1 Recursos De Hardware Disponibles (CPU, RAM, Disco)

Recurso	Mínimo requerido	Disponible (Azure B2as_v2)	Medido en operación	✓
CPU	2 vCPU x86-64 (SQL Server no corre en ARM)	2 vCPU AMD x64	Picos solo al compilar imágenes	✅
RAM	8 GB	7,7 GB + 4 GB de swap	**3,3 GB** usados con los 12 contenedores, incluido Portainer (19-10-2026)	✅
Disco	30 GB	64 GB SSD estándar	26 GB usados de 61 GB (42 %), sobre todo imágenes y caché de compilación (19-10-2026)	✅
Sistema operativo	Ubuntu 24.04 o 26.04 LTS	Ubuntu 24.04.4 LTS	—	✅
Red	Puertos 22, 80 y 443 abiertos	Grupo de seguridad de Azure	Verificado desde internet	✅

3.1.2 Estado Del Motor Docker Y Socket Local

```
docker --version            # Docker version 29.x
docker compose version      # Docker Compose v5.x
sudo systemctl is-enabled docker   # enabled  → arranca con la máquina
sudo systemctl is-active docker    # active
ls -l /var/run/docker.sock         # socket local del motor
```

`deploy/setup-server.sh` instala Docker (script oficial `get.docker.com`) si falta, lo habilita al arranque y crea 4 GB de swap.

3.2 Estrategia Y Ejecución De Respaldos (Backups)

> **Estado: automatizado desde el 21-10-2026.** Los respaldos, su verificación y la restauración se probaron en producción (ver 3.2.4).

3.2.1 Respaldo Lógico De Base De Datos (Dump / Snapshot)

`deploy/backup-db.sh` hace un respaldo completo de `LavaRapido` (`BACKUP DATABASE … WITH CHECKSUM`), comprueba que se puede restaurar (`RESTORE VERIFYONLY`), lo saca del contenedor y lo comprime con gzip, porque SQL Server Express no comprime sus respaldos. Queda en `~/lavarapido/backups/LavaRapido-AAAAMMDD-HHMMSS.bak.gz`, con permisos `600`, y se conservan los **últimos 14**.

Cuándo corre	Quién lo dispara
Antes de cada actualización	`update-server.sh` (si el respaldo falla, **no actualiza**)
5 minutos después de encender la VM	`crontab` de `azureuser` (`@reboot`)
Todos los días a las 23:00 UTC (6 p. m. en Colombia), si la VM está encendida	`crontab` de `azureuser`
A mano	`bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/backup-db.sh`

La VM se enciende a demanda; por eso, además del diario, se respalda al arrancar y antes de actualizar. La base usa el modelo de recuperación *`SIMPLE`* (lo aplica `db-init`): con respaldos completos no hacen falta respaldos del registro de transacciones, y el registro no crece sin límite.

Medición del 21-10-2026: la base ocupa 72 MB y el respaldo comprimido **1,4 MB**; tarda **menos de 2 segundos**.

Complemento a nivel de infraestructura: **snapshot del disco** de la VM desde el portal de Azure (Discos → Crear instantánea). Los respaldos viven en el mismo disco de la VM: protegen de un error humano o de una migración mala, no de perder la VM. Para tener una copia afuera, se bajan al PC:

```
scp -i ~/.ssh/lavarapido_azure "azureuser@64.236.160.129:~/lavarapido/backups/*.bak.gz" .
```

3.2.2 Respaldo De Volúmenes Persistentes De Docker

```
mkdir -p ~/backups
for v in lavarapido_sqlserver-data lavarapido_rabbitmq-data lavarapido_caddy-data; do
  sudo docker run --rm -v "$v":/data:ro -v ~/backups:/backup alpine \
    tar czf "/backup/${v}_$(date +%F).tar.gz" -C /data .
done
```

> Para un respaldo consistente de `sqlserver-data` se prefiere el `BACKUP DATABASE` de 3.2.1, porque se puede hacer en caliente.

3.2.3 Respaldo De Configuraciones De Stacks Y Variables Anteriores

```
cd ~/lavarapido/lavarapido-infra
cp .env.production ~/backups/env.production_$(date +%F)       # contiene secretos: chmod 600
chmod 600 ~/backups/env.production_*
git -C ~/lavarapido/lavarapido-infra rev-parse HEAD > ~/backups/infra-commit_$(date +%F).txt
```

La configuración del stack (`docker-compose.yml`, `docker-compose.prod.yml`, `deploy/Caddyfile`) está versionada en GitHub (`lavarapido-infra`). Para volver atrás basta un `git checkout <commit>` y un nuevo `up -d`.

3.2.4 Verificación Automática Y Restauración

Verificación automática. Después de cada respaldo programado corre `deploy/verify-backup.sh`: restaura el último respaldo con otro nombre (`LavaRapido_verificacion`), revisa que tenga las tablas de la base real y que se pueda leer, y la borra. Así se sabe cada día que los respaldos sirven, **sin tocar la base real**.

Restauración. Nunca es automática: volver a un respaldo borra lo que pasó después, así que siempre la decide una persona. Desde el 24-10-2026 `restore-db.sh` toma el mismo candado que el despliegue, exige una terminal, muestra la fecha del respaldo y los pasos antes de pedir la confirmación, corre `payment-migrate` al final y nunca deja los servicios detenidos. Los respaldos `LavaRapido-pre-update-*` que hace cada actualización se guardan aparte (los últimos 10), además de los 14 normales. *Riesgo abierto (ACO-37):* el respaldo de seguridad que hace antes de restaurar aplica la retención de 14 y podría borrar el archivo que se va a restaurar si es el más viejo; conviene restaurar un respaldo reciente o copiarlo antes a otra carpeta.

```
bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/restore-db.sh <archivo.bak.gz> --as LavaRapido_prueba   # revisar un
respaldo sin tocar la base
bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/restore-db.sh <archivo.bak.gz>     # volver la base a ese respaldo
```

En el segundo caso el script pide escribir `RESTAURAR`, guarda primero un respaldo de cómo estaba la base, detiene los 7 servicios, restaura y los vuelve a levantar (2 a 3 minutos sin servicio). Si la restauración falla, la base queda abierta como estaba y los servicios vuelven a arrancar.

Bitácora. Cada respaldo, verificación y restauración, también las canceladas o fallidas, queda en `~/lavarapido/backups/backup.log`:

```
2026-10-21 06:11:16 UTC | RESTAURACIÓN | CANCELADA | LavaRapido-20261021-061111.bak.gz -> LavaRapido | azureuser
2026-10-21 06:12:05 UTC | RESPALDO | OK | LavaRapido-20261021-061204.bak.gz (1.4M) | azureuser
2026-10-21 06:12:08 UTC | VERIFICACIÓN | OK | LavaRapido-20261021-061204.bak.gz: 69 tablas, 4 usuarios, 2 reservas |
azureuser
```

Se consulta con `tail -20 ~/lavarapido/backups/backup.log`; solo los problemas, con `grep FALLÓ ~/lavarapido/backups/backup.log`.

Pruebas realizadas en producción (21-10-2026):

Prueba	Resultado
Respaldo manual y antes de actualizar	✅ 1,4 MB, verificado
Restaurar con otro nombre y comparar con la base real	✅ Mismos registros en usuarios, reservas, pagos, avisos y operarios; 69 tablas
Restaurar encima de la base real	✅ Datos idénticos; los 11 contenedores volvieron a `healthy`; base `MULTI_USER / ONLINE / SIMPLE`
Verificación con un respaldo dañado a propósito	✅ Detectado y anotado como `FALLÓ`, sin dejar bases de prueba ni archivos temporales
Restauración cancelada	✅ Anotada como `CANCELADA`

3.3 Gestión De Variables De Entorno Y Secretos

- Los secretos viven **solo** en `~/lavarapido/lavarapido-infra/.env.production` (permisos `600`), que está en `.gitignore`.
- La plantilla sin valores es `.env.production.example`.
- **Generación de llaves:** las llaves se generaron **en el servidor** con `openssl rand -base64 48` y nunca se copiaron ni se mostraron.
- **Primer administrador:** el responsable escribió `ADMIN_EMAIL` y `ADMIN_PASSWORD` directamente en `.env.production` del servidor; security-service creó la cuenta al arrancar porque no existía ningún administrador (`AdministratorBootstrapRunner`). La contraseña no está en ningún repositorio.

3.3.1 Parámetros De Conexión a Base De Datos

Variable	Descripción
`DB_PASSWORD`	Contraseña de `sa` (8+ caracteres, mayúscula, minúscula, número y símbolo)
`DB_NAME`	`LavaRapido`
`DB_USERNAME`	`sa` *(mejora pendiente: usuario con permisos limitados)*
`DB_URL` (compose)	`jdbc:sqlserver://sqlserver:1433;databaseName=LavaRapido;encrypt=true;trustServerCertificate=true`

3.3.2 Claves De Firmado De Tokens (JWT Secret Keys)

Variable	Descripción
`JWT_SECRET`	Llave HS256 compartida por los servicios que validan tokens (≥ 32 bytes). Los tokens duran **1 hora**
`INTERNAL_API_KEY`	Llave de las rutas `/internal/**` entre servicios (cabecera `X-Internal-Key`)
`RABBITMQ_USERNAME` / `RABBITMQ_PASSWORD`	Usuario propio de RabbitMQ (no `guest`)
`MAIL_USERNAME` / `MAIL_PASSWORD` / `MAIL_FROM`	Cuenta Gmail con contraseña de aplicación
`ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD`	Primer administrador (solo se usa si la base no tiene ninguno)
`PUBLIC_URL` / `SITE_ADDRESS`	Dirección pública (CORS, enlaces de correo) y dominio de Caddy
`PUSH_ENABLED` / `MESSAGING_ENABLED`	`true`: push con Expo y eventos con RabbitMQ

Las variables del 21-10-2026 no son obligatorias en `.env.production`: `SESSION_CHECK_ENABLED`, `SESSION_CHECK_CACHE_TTL` y `SESSION_CHECK_TIMEOUT` (chequeo de sesión del gateway: activo, 30 s y 3 s), `BOOKING_EXPIRY_CHECK_ENABLED` y `BOOKING_EXPIRY_CHECK_INTERVAL` (cancelación de las reservas programadas que vencieron sin confirmarse: activa y cada 5 minutos), `BOOKING_EXPIRY_GRACE_MINUTES` (60 minutos de margen, que usan booking-service y

operations-service) y `FOLLOW_UP_ENABLED`, `FOLLOW_UP_INTERVAL` y `FOLLOW_UP_LOOK_BACK_DAYS` (seguimiento de las reservas que terminaron y nadie cerró: activo, cada 5 minutos y revisando los últimos 28 días, porque la máquina puede pasar semanas apagada) quedan con su valor por defecto si no se escriben; `docker-compose.yml` sí las pasa a los contenedores, así que se pueden cambiar en `.env.production`. Lo mismo vale para `ALLOWED_EMAIL_DOMAINS` (dominios de correo que acepta security-service en el registro, al crear usuarios y al cambiar el correo, por defecto `gmail.com`; en producción desde el 24-10-2026).

Variables del 24-10-2026, todas con valor por defecto en el servicio; el compose no las pasa, así que para cambiarlas hay que agregarlas al bloque `environment` del servicio en `docker-compose.yml`:

Variable	Servicio	Valor por defecto	Para qué
`AUTH_RATE_LIMIT_ENABLED`, `AUTH_RATE_LIMIT_REQUESTS`, `AUTH_RATE_LIMIT_WINDOW`	api-gateway	`true`, `60`, `1m`	Límite de peticiones por IP en `/api/v1/auth/**` (429 `RATE_LIMITED`). Si el registro del gateway muestra que todas las peticiones vienen de una IP `172.x`, todos los usuarios comparten la misma cubeta: hay que revisar cómo llega `X-Forwarded-For`
`TRUSTED_PROXIES`	api-gateway	Redes privadas y locales (`127.0.0.0/8`, `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`, `::1`, `fc00::/7`)	Solo se cree el `X-Forwarded-For` que llega desde estas redes (Caddy)
`ROUTE_CONNECT_TIMEOUT`, `ROUTE_READ_TIMEOUT`	api-gateway	`5s`, `60s`	Tiempo para conectar y para leer la respuesta de cada servicio; si se pasa, responde 500
`START_LATE_LIMIT`	operations-service	`PT4H`	Hasta cuánto después de la hora de fin el operario puede iniciar (409 `SERVICE_TOO_LATE`)

Además, **customer-service** recibe desde el 24-10-2026 `BOOKING_SERVICE_URL` (fija en el compose: `http://booking-service:3003`, la raíz del servicio, sin `/api/v1`) e `INTERNAL_API_KEY` (la misma de los demás; en producción es obligatoria y, sin ella, el compose no arranca), para preguntar a booking-service si un vehículo tiene reservas activas antes de retirarlo. Opcional: `BOOKING_SERVICE_TIMEOUT` (3 s). En booking-service ya no existen `BOOKING_EXPIRY_CHECK_ENABLED` ni `BOOKING_EXPIRY_CHECK_INTERVAL` (la tarea se quitó, B-07); el compose todavía las pasa sin efecto (ACO-40). `ADMIN_DOCUMENT` y `ADMIN_PHONE` completan la cédula y el celular del primer administrador junto a `ADMIN_EMAIL` y `ADMIN_PASSWORD`. Las variables `DEMO_*_PASSWORD` no se usan en producción: solo existen en el perfil `dev`.

Variables del 26-10-2026 (pago al reservar). Las cuatro de booking-service tienen valor por defecto, están comentadas en `.env.example` y el compose ya las pasa al contenedor, así que se pueden cambiar en `.env.production`:

Variable	Servicio	Valor por defecto	Para qué
`BOOKING_CASH_ACTIVE_LIMIT`	booking-service	`1`	Máximo de reservas activas en efectivo por cliente (409 `CASH_BOOKING_LIMIT`)
`BOOKING_PAYMENT_WINDOW`	booking-service	`30m`	Plazo para subir el comprobante de una reserva con pago digital (o la hora de inicio, si es más pronto)
`BOOKING_PAYMENT_EXPIRY_ENABLED`	booking-service	`true`	Activa `PaymentDeadlineJob`, que cancela con `PAYMENT_TIMEOUT` las reservas digitales vencidas
`BOOKING_PAYMENT_EXPIRY_INTERVAL`	booking-service	`60s`	Cada cuánto corre esa tarea
`PAYMENT_SERVICE_URL`	booking-service	`http://payment-service:3005` (fija en el compose)	Raíz de payment-service para la consulta interna antes de cancelar
`INTERNAL_API_KEY`	booking-service y payment-service	Sin valor por defecto	La misma de los demás. Desde el 26-10-2026 **payment-service también la necesita**: `docker-compose.prod.yml` la exige (el compose no arranca sin ella) y, sin ella, la ruta interna de payment queda cerrada y booking no cancela ninguna reserva por falta de pago

3.3.3 Límites De Memoria Y Runtime (JVM -Xmx, ASPNETCORE_ENVIRONMENT)

Contenedor	Límite (`mem_limit`)	Runtime
5 servicios Java + gateway	512 MB c/u	`java -XX:MaxRAMPercentage=75` → heap máximo ≈ 384 MB · perfil `prod` (sin Swagger)
payment-service	384 MB	`ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production`
SQL Server	`MSSQL_MEMORY_LIMIT_MB=1536`	`MSSQL_PID=Express`
web / caddy	64 MB c/u	nginx / Caddy
Todos	`restart: unless-stopped`	Se reinician solos ante fallos y al arrancar la máquina
Todos (desde el 20-10-2026)	Registros: 3 archivos de 10 MB (`json-file`) · chequeo de salud cada 30 s	Los servicios Java tienen 150 s para arrancar antes de contar fallos. Docker no reinicia solo un contenedor `unhealthy`: el estado se ve en `docker compose ps`, Portainer y `update-server.sh`

3.4 Protocolo De Comunicación Y Ventana De Mantenimiento

1. **Aviso previo (24 h):** el DevOps informa al equipo por el grupo del proyecto la fecha, la ventana y los cambios (release notes).
2. **Congelamiento:** no se fusiona nada a la rama que se despliega durante la ventana. Con el despliegue continuo (4.3.4) cada fusión a `main` despliega sola y recrea contenedores durante 1 o 2 minutos, así que `main` también se congela el día de la exposición (27-10-2026).
3. **Inicio:** se informa "inicio de despliegue". `update-server.sh` toma el respaldo de la base antes de actualizar (sección 3.2).
4. **Ejecución:** runbook de la sección 4.
5. **Verificación:** pruebas de humo de la sección 5. El QA confirma cada rol.
6. **Cierre:** se informa "despliegue terminado" con la versión y las evidencias. Si falla, **rollback**. `update-server.sh` vuelve a bajar la punta de la rama de cada repositorio (llama a `setup-server.sh`), así que un `git checkout` hecho a mano en el servidor se pierde en la siguiente actualización. Desde el 24-10-2026 `setup-server.sh` nunca baja de versión: si lo desplegado no está contenido en la rama pedida, se detiene sin tocar nada (`ALLOW_DOWNGRADE=1` lo permite a propósito). Por eso:

7. **En GitHub (lo normal):** revertir el cambio en la rama que se despliega (`git revert` del commit, o `git revert -m 1` de la fusión, en una rama `fix/…` con su PR) y volver a desplegar: con el despliegue continuo basta con fusionar la reversión a `main`.
8. **De urgencia en el servidor:** `update-server.sh` guarda solo, antes de reconstruir, la versión que corre como `:prev` (si la última actualización falló, no la pisa). Para volver: `ssh -t` al servidor y `bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/rollback.sh` (todos) o `rollback.sh web` (algunos). Muestra de qué fecha es la versión anterior de cada servicio, pide escribir `VOLVER`, espera si hay otra actualización corriendo (mismo candado), recrea esos contenedores sin compilar, espera hasta 8 minutos a que queden sanos y lo anota en `backups/deploy.log`. No toca la base ni los repositorios: después se revierte en GitHub. *Riesgo abierto (ACO-37):* `rollback.sh` usa el compose y el `Caddyfile` actuales; si entre las dos versiones cambió un contrato (como el puerto 80 → 8080 de la web), la vuelta atrás puede dejar ese servicio caído, y `update-server.sh` corrido a mano no toma el candado.
9. **Datos:** si la migración dañó datos, restaurar el respaldo `LavaRapido-pre-update-…` tomado antes de actualizar con `restore-db.sh` (sección 3.2.4); devuelve **toda** la base a ese momento y, desde el 24-10-2026, corre `payment-migrate` al final.
10. **Ventana estándar:** fuera del horario de atención del lavadero (antes de las 07:00 o después de las 18:00, hora de Colombia).

4. Procedimiento De Despliegue Paso a Paso (Runbook)

4.1 Verificación Y Acceso a La Plataforma Base (Portainer CE)

Acceso al servidor:

```
ssh -i ~/.ssh/lavarapido_azure azureuser@64.236.160.129
```

Acceso de cada integrante con su propia llave: cada persona crea su llave en su computador y solo comparte la parte pública (`.pub`). La privada nunca se envía ni se sube a un repositorio.

```
ssh-keygen -t ed25519 -f $HOME\.ssh\lavarapido_azure      # en el PC de la persona
Get-Content $HOME\.ssh\lavarapido_azure.pub                # esta línea es la que se comparte
```

El responsable de DevOps la agrega una sola vez, desde el portal (*vehiclecarwash-vm → Restablecer contraseña → Restablecer clave pública SSH*, usuario `azureuser`) o desde el servidor con `echo "<llave pública>" >> ~/.ssh/authorized_keys`. Al 19-10-2026 tienen acceso la llave del responsable de DevOps, la de Juan Camilo y la de GitHub Actions (restringida, ver 4.3.3). Para quitar un acceso basta con borrar su línea de `authorized_keys`.

Instalación de Portainer CE *(realizada el 16-10-2026; escucha solo dentro del servidor)*:

```
sudo docker volume create portainer_data
sudo docker run -d --name portainer --restart unless-stopped \
  -p 127.0.0.1:9443:9443 \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:2.21.5
```

Acceso desde el PC del administrador (túnel SSH, sin abrir puertos):

```
ssh -i ~/.ssh/lavarapido_azure -L 9443:localhost:9443 azureuser@64.236.160.129
# luego abrir https://localhost:9443 → usuario "admin"
```

- **Contraseña del usuario `admin`:** se generó al instalar y está en el servidor, en `~/portainer-admin-password` (permisos `600`). Se consulta con `cat ~/portainer-admin-password` y se puede cambiar desde Portainer (*My account*).
- **Entorno `local`:* *registrado sobre el socket de Docker. En *Containers* y *Stacks* aparece `lavarapido`.

4.2 Despliegue Y Migración De Base De Datos

4.2.1 Ejecución De Scripts DDL/DML O Herramientas De Migración (Liquibase)

Las migraciones son **automáticas**:

1. El contenedor `db-init` crea la base `LavaRapido` si no existe y la deja en modelo de recuperación `SIMPLE`.
2. El contenedor `payment-migrate` (Liquibase 4.29) aplica los changelogs de payment-service (`db/changelog/db.changelog-master.yaml`) y termina.
3. Cada servicio Java aplica sus propios changelogs al arrancar. La numeración es global: 001–041 más las semillas 1xx de catálogos (la 040 de operations-service y la 041 de notification-service son del 21-10-2026 y se aplicaron en el servidor el 22-10-2026). En `develop` del 23-10-2026 se agregaron la 042 (operations-service, notas de la asignación) y la 043 (booking-service, puntos de fidelización por línea de reserva), que entran con `v1.1.0` junto con la 021 de payment-service (una promoción por reserva); la siguiente libre es la 044.
4. Hibernate solo valida que el modelo coincida con las tablas (`ddl-auto: validate`); nunca altera tablas.

Producción **no carga datos de prueba**: solo catálogos (roles, servicios, estados, horario y datos del negocio).

4.2.2 Verificación De Integridad De Esquemas, Índices Y Usuarios

```
P=$(grep '^DB_PASSWORD=' .env.production | cut -d= -f2-)
q(){ sudo docker exec -e SQLCMDPASSWORD="$P" lavarapido-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
     -S localhost -U sa -C -d LavaRapido -Q "SET NOCOUNT ON; $1"; }
q "SELECT s.name AS esquema, COUNT(t.name) AS tablas FROM sys.schemas s JOIN sys.tables t ON t.schema_id=s.schema_id
GROUP BY s.name"
for s in SECURITY CUSTOMER BOOKING OPERATIONS NOTIFICATION PAYMENT; do
  q "SELECT '$s' AS servicio, COUNT(*) AS changesets, SUM(CASE WHEN EXECTYPE IN ('EXECUTED','MARK_RAN') THEN 1 ELSE 0
END) AS ok FROM DATABASECHANGELOG_$s"
done
q "SELECT COUNT(*) AS indices FROM sys.indexes WHERE object_id IN (SELECT object_id FROM sys.tables)"
q "SELECT u.username, r.code FROM security.app_user u JOIN security.user_role ur ON ur.user_id=u.user_id JOIN
security.role r ON r.role_id=ur.role_id WHERE r.code='ADMIN'"
```

Resultado esperado:

- los 9 esquemas con sus tablas;
- en cada servicio, `ok` igual a `changesets` (16-10-2026: 143 de 143; 19-10-2026: 144 de 144, con la 039); desde el 22-10-2026 aparecen también la 040 en `DATABASECHANGELOG_OPERATIONS` y la 041 en `DATABASECHANGELOG_NOTIFICATION`;
- el administrador inicial creado (log de security: `First administrator created`).

4.3 Despliegue Y Orquestación Del Stack De Aplicación

4.3.1 Carga Del Archivo docker-compose.yml En Portainer

El stack se define con dos archivos versionados en `lavarapido-infra`:

- **`docker-compose.yml`:** base, la misma que en desarrollo.
- **`docker-compose.prod.yml`:** sobrescribe lo de producción: sin puertos internos, perfil `prod`, límites de memoria, Caddy, web y CORS.

Despliegue actual (CLI):

```
# 1. Bajar los 9 repositorios (y preparar Docker y swap la primera vez)
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-infra/main/deploy/setup-server.sh -o setup-
server.sh
bash setup-server.sh
```

El script se baja de `main` (versión `v1.0.0`). En esa versión clona y actualiza la rama `develop` de cada repositorio (variable `BRANCH`). El de `develop` (el que corre en el servidor desde el 24-10-2026) clona `main` por defecto, salvo los repositorios de `DEVELOP_ONLY` (hoy payment-service; desde el 24-10-2026 su `main` ya tiene `v1.0.0` con todo su `develop`, así que se puede quitar de la lista), y nunca baja de versión: si un repositorio ya bajado tiene algo que la rama pedida no contiene, se detiene sin tocarlo. Hasta liberar `v1.1.0` hay que usar `BRANCH=develop bash setup-server.sh`.

Con Portainer: Stacks → Add stack → *Repository*. Las imágenes se construyen desde 9 repositorios hermanos, así que el flujo recomendado es:

1. compilar las imágenes con el CLI (paso 4.3.3);
2. usar Portainer para **ver, reiniciar, revisar logs y consumo** de los contenedores del stack `lavarapido`, que aparece como stack "limitado" porque fue creado fuera de Portainer.

4.3.2 Inyección De Variables De Entorno Del Stack

```
cd ~/lavarapido/lavarapido-infra
cp .env.production.example .env.production
chmod 600 .env.production
nano .env.production        # completar los valores de la sección 3.3 (llaves generadas con openssl)
```

En Portainer, las mismas variables se cargan en *Environment variables → Load variables from .env file*.

4.3.3 Despliegue De Servicios Y Actualización De Imágenes De Contenedor

Primer despliegue:

```
cd ~/lavarapido/lavarapido-infra
sudo docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml \
  --env-file .env.production --profile app up -d --build
```

Actualizaciones posteriores: suben primero los cambios a GitHub y luego (el script respalda la base antes de tocar nada y, si el respaldo falla, no actualiza):

```
bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/update-server.sh                # todo
bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/update-server.sh web            # solo la web
bash ~/lavarapido/lavarapido-infra/deploy/update-server.sh security-service notification-service
```

Hasta liberar `v1.1.0`, las actualizaciones a mano llevan `BRANCH=develop` delante (`BRANCH=develop bash …/update-server.sh`); sin ella, la protección de `setup-server.sh` se detiene. Si todo queda sano, el script borra las imágenes sin uso (se conservan la actual y `:prev`) y la caché de compilación de más de 7 días.

Desde GitHub, sin SSH: con la máquina encendida, en el repositorio `lavarapido-infra` → *Actions* → *Desplegar en Azure* → *Run workflow*. El botón existe desde el 23-10-2026, cuando `deploy.yml` llegó a `main` (la rama por defecto) con la versión `v1.0.0`; en esa versión el flujo llama a `update-server.sh`, que despliega `develop`. En *Servicios* se deja vacío para actualizar todo o se escriben los nombres (`web payment-service`). Al terminar, el flujo comprueba que la web y la API respondan 200. Usa una llave propia de GitHub (secreto `AZURE_SSH_KEY`) que en el servidor solo puede ejecutar `deploy/ci-deploy.sh`, que valida los nombres y no deja correr dos actualizaciones a la vez. **Al 24-10-2026 el flujo no se ha ejecutado nunca** (el despliegue de ese día se hizo por SSH) y el repositorio no tiene ningún secreto, así que fallaría hasta crear `AZURE_SSH_KEY` e instalar su línea en `authorized_keys` del servidor; mientras tanto se usa la opción por SSH de arriba.

Integración continua: desde el 19-10-2026 los 10 repositorios tienen `.github/workflows/ci.yml`, que corre en cada push o pull request a `develop` y `main`, y el resultado aparece como ✓ o ✗ junto a cada commit. Al 27-10-2026 la última corrida de `main` está en verde en los 10 (1 337 pruebas, incluidas las 17 de integración de payment):

Repositorio	Qué revisa
Servicios Java y api-gateway	`./mvnw verify`: compila y corre las pruebas (Java 21)
payment-service	`dotnet build` y `dotnet test` (.NET 8). Desde el 27-10-2026 el job «Pruebas de integración» corre las 17 de integración contra SQL Server 2022 con las migraciones de Liquibase, sin omitir ninguna
Front-end-proyecto-web	Compilación de producción y `ng test`
LavadoVehicular-Movil	`tsc --noEmit` y `jest` (`jest-expo`, 106 pruebas al 27-10-2026). El APK se sigue generando con EAS; `cd.yml` publica la actualización por internet al llegar a `main` (4.3.4)
lavarapido-infra	Sintaxis y `shellcheck` de `deploy/*.sh`, `docker compose config`, `actionlint` de los flujos y sintaxis de `e2e/` y `e2e/remote/`. La batería remota se corre a mano con `e2e.yml` (sin correr todavía contra el servidor)

4.3.4 Despliegue Continuo (Activo Desde El 26-10-2026)

El despliegue continuo está fusionado en `develop` desde el 24-10-2026: `lavarapido-infra` (`006b5b0`) y el job **Pedir despliegue** en los 8 repositorios que se despliegan en Azure (web, api-gateway, security, customer, booking, operations, notification y payment), más `cd.yml` en la app móvil. Llegó a `main` con `v1.1.0` y, con los secretos creados, **corrió solo por primera vez el 26-10-2026 por la noche** (sección 1.3.12). Así funciona:

1. Cuando un PR aprobado entra a `main`, el `ci.yml` del repositorio corre el CI y, si pasa, su job **Pedir despliegue** lanza el flujo **Desplegar en Azure** de `lavarapido-infra` con `automatic=true` (secreto `DEPLOY_DISPATCH_TOKEN`: un token *fine-grained* con acceso solo a `lavarapido-infra` y permiso *Actions: Read and write*). Una fusión a `main` de `lavarapido-infra` también despliega. El ✓ de **Pedir despliegue** solo dice que el pedido llegó; el resultado está en *Actions* → *Desplegar en Azure* de `lavarapido-infra`.
2. El flujo entra por SSH (`AZURE_SSH_KEY`), respalda la base, baja `main` de todos los repositorios (desde *v1.1.1* de infra también payment-service, que antes se quedaba en `develop` por `DEVELOP_ONLY`) y reconstruye lo que cambió, guardando antes la versión que corre como `:prev`. Si ya hay otra actualización corriendo, por ejemplo la del arranque de la máquina, espera hasta 20 minutos y después actualiza. Luego espera hasta 8 minutos a que **todos** los contenedores queden sanos: si alguno no arranca, el flujo termina en rojo y dice cuál. Si cambió el `Caddyfile`, reinicia Caddy. Al final comprueba que la web y la API respondan 200 y, si no, muestra lo que respondió la API.
3. Si la máquina está **apagada** (no responden ni el SSH ni el sitio), el flujo automático deja un aviso y no falla; si el sitio responde pero el SSH no, sale en rojo. Al encenderla, `deploy/boot-update.sh` (tarea `@reboot`, instalada en el servidor desde el 24-10-2026) baja lo nuevo de `main` y actualiza si hay algo sin desplegar, comparando con `~/lavarapido/backups/deployed-heads`, que solo se escribe cuando una actualización completa termina bien. El resultado queda en `~/lavarapido/backups/deploy.log`.
4. **App móvil (OTA):** no se despliega en Azure. Su `cd.yml` corre con cada push a `main` (no con cambios de solo `.md` o `docs/`) o a mano, pero solo publica desde `main`: repite el CI (`tsc` y `jest`), compara la huella nativa del código con la del APK publicado y, si coincide, corre `eas update --channel preview`; si cambió, falla pidiendo un APK nuevo (`eas build` y `publish:apk`, que siguen siendo a mano). Usa el secreto `EXPO_TOKEN`.

Cómo se activó (AC-90 del documento de Acciones Correctivas; los secretos ya están creados desde el 26-10-2026):

Repositorio	Secreto	Lo crea
`lavarapido-infra`	`AZURE_SSH_KEY` (y su línea `restrict,command="bash …/deploy/ci-deploy.sh"` en `~/.ssh/authorized_keys` del servidor)	Brayan Patiño
web, api-gateway, security, operations y notification	`DEPLOY_DISPATCH_TOKEN`	Brayan Patiño
customer y booking	`DEPLOY_DISPATCH_TOKEN` (el mismo token)	Juan Camilo Guilombo o alguien con rol Admin
payment	`DEPLOY_DISPATCH_TOKEN`	Merari Urbano o alguien con rol Admin
LavadoVehicular-Movil	`EXPO_TOKEN` (cuenta de Expo del proyecto)	Merari Urbano o alguien con rol Admin

Si falta `DEPLOY_DISPATCH_TOKEN`, el job **Pedir despliegue** de ese repositorio sale en rojo aunque el CI pase. **Orden del release `v1.1.0`:* *primero la web, los servicios y payment (su pedido de despliegue falla con *422* mientras `deploy.yml` de `main` de

infra no acepte `automatic`, sin hacer daño) y `lavarapido-infra` al final; después se quita payment de `DEVELOP_ONLY`. Se revisa con `crontab -l | grep boot-update` y `git -C ~/lavarapido/Front-end-proyecto-web branch --show-current` (debe decir `main`).

Publicación de la app móvil, desde el PC, en la carpeta de la app:

```
eas build -p android --profile preview          # APK nuevo (cambios nativos)
npm run publish:apk -- "qué cambió"             # lo publica en /app/ y avisa por push
npm run publish:update -- "qué cambió"          # cambios solo de pantallas: actualización por internet
```

4.4 Configuración De Enrutamiento, Dominio Y Certificados SSL/TLS

1. **Dominio:** Azure → IP pública `vehiclecarwash-vm-ip` → Configuración → *Etiqueta de nombre DNS* = `lavarapidovehicular`. Queda `lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com`.
2. **Variables:** `.env.production`: `` SITE_ADDRESS=lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com PUBLIC_URL=https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com
3. **Aplicar:** `update-server.sh caddy security-service notification-service api-gateway`. Caddy pide el certificado a Let's Encrypt por HTTP-01; el puerto 80 debe estar abierto.
4. **Verificar el certificado:** ``bash echo | openssl s_client -connect lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com:443 \ -servername lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com 2>/dev/null | openssl x509 -noout -issuer -enddate # issuer=C=US, O=Let's Encrypt · notAfter=Jan 14 2027
5. **App móvil:** `EXPO_PUBLIC_API_URL` en `eas.json` = `https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com/api/v1`, y se compila el APK.

5. Plan De Verificación, Pruebas Y Evidencias (Smoke Tests)

5.1 Matriz De Enlaces Y Endpoints De Verificación De Servicios

5.1.1 Acceso Al Panel Administrativo (Portainer)

Enlace	Esperado	Estado
`https://localhost:9443` (por túnel SSH)	Stack `lavarapido`: 11 contenedores *running/healthy* y 2 de inicialización en *exited (0)*	✅ (ver 5.4.1)
`https://64.236.160.129:9443` (desde internet)	Sin conexión	✅ cerrado

5.1.2 Interfaz Web Pública (SPA Angular)

Enlace	Esperado	Resultado (19-10-2026)
`https://<dominio>/`	Página de inicio con la sección "Descargar app"	✅ 200
`https://<dominio>/client`, `/admin`	Rutas de Angular (cargan `index.html`)	✅ 200
`http://<dominio>/`	Redirección a HTTPS	✅ 308
`https://<dominio>/app/version.json`	Versión publicada de la app	✅ 200 (`versionCode` 5, versión 1.1.0)
`https://<dominio>/app/LavaRapidoVehicular.apk`	Descarga del APK (`application/vnd.android.package-archive`)	✅ 200

5.1.3 Endpoints De Salud Del Backend (/actuator/health)

Los endpoints de salud **no se publican a internet**: `/actuator` no está bajo `/api`. Se revisan dentro del servidor:

```
for s in security-service:3001 customer-service:3002 booking-service:3003 operations-service:3004 notification-
service:3006 api-gateway:8080; do
  sudo docker run --rm --network lavarapido_default curlimages/curl:8.10.1 -s "http://$s/actuator/health"; echo "  ←
$s"
done
sudo docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.production --profile app ps
```

Esperado: `{"status":"UP"}` en cada servicio Java, y todos los contenedores `Up (healthy)`. `db-init` y `payment-migrate` deben quedar en `Exited (0)`.

5.1.4 Documentación Interactiva De La API (Swagger UI / OpenAPI)

- **En producción está deshabilitada a propósito** (perfil `prod`): no se expone la estructura de la API.
- Se consulta en **desarrollo**, con cada servicio en perfil `dev`: `http://localhost:3001/swagger-ui.html`, y así para cada puerto.
- La especificación OpenAPI está versionada en `vehicle-w-docs`.

5.1.5 Conectividad TCP Directa a Motor De Base De Datos

SQL Server **no tiene el puerto 1433 publicado**. La conectividad se prueba desde la red interna:

```
P=$(grep '^DB_PASSWORD=' .env.production | cut -d= -f2-)
sudo docker exec -e SQLCMDPASSWORD="$P" lavarapido-sqlserver /opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd \
  -S localhost -U sa -C -Q "SELECT @@VERSION, DB_NAME(DB_ID('LavaRapido'))"
nc -zv 64.236.160.129 1433    # desde afuera: debe FALLAR (puerto cerrado)
```

5.2 Pruebas De Humo Funcionales (Smoke Tests)

5.2.1 Flujo De Autenticación Y Emisión De Tokens

Prueba	Esperado	Resultado
`POST /api/v1/auth/login` con cuerpo vacío	400 (validación)	✅ 400
Login con credenciales inválidas	401 `INVALID_CREDENTIALS`	✅ 401
Login del administrador inicial desde la web	Token JWT con rol `ADMIN` y acceso a `/admin`	✅
Petición desde un origen ajeno (CORS)	403	✅ 403
Ruta interna sin llave (`/internal/...`)	401; desde internet, inaccesible	✅ 401 / 405

5.2.2 Pruebas De Lectura Y Consulta De Datos

Prueba	Resultado
`GET /api/v1/catalog/services` (catálogo público)	✅ 200 con los servicios
`GET /api/v1/schedule/business-hours`	✅ 200
`GET /api/v1/establishment`	✅ 200

5.2.3 Pruebas De Escritura Y Persistencia Transaccional

Prueba automatizada de punta a punta: `lavarapido-infra/e2e/full-flow.test.js` (`npm run flow`). Corre solo en local, contra los contenedores de `docker compose --profile app` (lee el `.env` local y usa `docker exec`); el CI de GitHub solo revisa su sintaxis (`node --check`) y no la ejecuta contra el servidor. Recorre los tres roles por el gateway:

#	Paso	Resultado
1	El cliente reserva eligiendo operario → asignación automática → avisos	✅
2	El cliente reporta el pago con comprobante → queda en revisión	✅
3	El administrador aprueba el pago → el cliente lo ve aprobado y gana puntos	✅
4	El operario inicia y termina el servicio → avisos al cliente	✅
5	El cliente califica → el operario ve la calificación	✅

- **Al terminar:** la prueba borra todo lo que creó y restaura los puntos del cliente.
- **En producción también se verificó:**
- envío real de correo (código de recuperación por Gmail);
- push real al celular;
- el interruptor de push (apagado → solo bandeja; encendido → push).

5.2.4 Verificación De Encabezados De Seguridad

Desde el 20-10-2026 Caddy agrega a todas las respuestas (web, API y descargas) los encabezados de seguridad, y a la web una política de contenido (CSP) que solo permite código propio más Google Fonts y las banderas de jsDelivr.

```
curl -s -I https://lavarapidovehicular.northcentralus.cloudapp.azure.com/ | grep -iE "strict|content-security|x-frame|x-content|referrer|permissions|server"
```

Prueba	Esperado	Resultado (20-10-2026)
Encabezados en la web, `/api` y `/app`	HSTS, `nosniff`, `X-Frame-Options: SAMEORIGIN`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`; CSP en la web	✅ Sin encabezados repetidos
Encabezado `Server`	No aparece (antes mostraba `nginx/1.27.5`)	✅
Web con el CSP activo (portada, login, registro, recuperar contraseña)	Carga completa: estilos, fuentes, banderas, QR	✅ 0 bloqueos y 0 errores en consola
Cargar un script externo desde la consola del navegador (simula un ataque)	El navegador lo bloquea: *Refused to load the script … Content Security Policy*	✅ Bloqueado

5.3 Inspección De Logs Y Monitoreo De Recursos

5.3.1 Revisión De Trazas De Inicio Sin Excepciones Críticas

```
C="sudo docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.production --profile app"
$C logs --since 10m | grep -iE "ERROR|Exception|APPLICATION FAILED" | head
for s in security-service customer-service booking-service operations-service notification-service api-gateway; do
  sudo docker logs lavarapido-$s 2>&1 | grep -oE "Started [A-Za-z]+ in [0-9.]+ seconds" | tail -1
done
sudo docker logs lavarapido-payment-service 2>&1 | grep "Now listening"
```

Esperado:

- cada servicio con su `Started ... in N seconds`;
- payment con `Now listening on: http://0.0.0.0:3005`;
- sin `APPLICATION FAILED TO START`.

5.3.2 Monitoreo De Consumo De CPU Y Memoria RAM En Contenedores

```
sudo docker stats --no-stream --format "table {{.Name}}\t{{.CPUPerc}}\t{{.MemUsage}}"
free -h
```


Medición del 19-10-2026, con el sistema en reposo y la máquina recién encendida:

Contenedor	Memoria
security-service	311 MB / 512 MB
notification-service	326 MB / 512 MB
operations-service	327 MB / 512 MB
booking-service	341 MB / 512 MB
customer-service	292 MB / 512 MB
api-gateway	176 MB / 512 MB
payment-service	78 MB / 384 MB
sqlserver	777 MB
rabbitmq	148 MB
web / caddy	12 MB / 60 MB
portainer	61 MB
Total de la máquina	**3,3 GB de 7,7 GB · swap sin uso**


5.4 Registro De Evidencias Visuales (Screenshots)

> Las capturas de terminal y de la web se tomaron el 19-10-2026 sobre el servidor de producción, con la versión desplegada ese día a las 03:20; las de terminal muestran la salida real de los comandos. Las de Portainer (5.4.1) son del 16-10-2026, porque el panel pide iniciar sesión y solo lo usa el responsable de DevOps.

5.4.1 Captura Del Panel De Portainer Con Contenedores En Estado Running

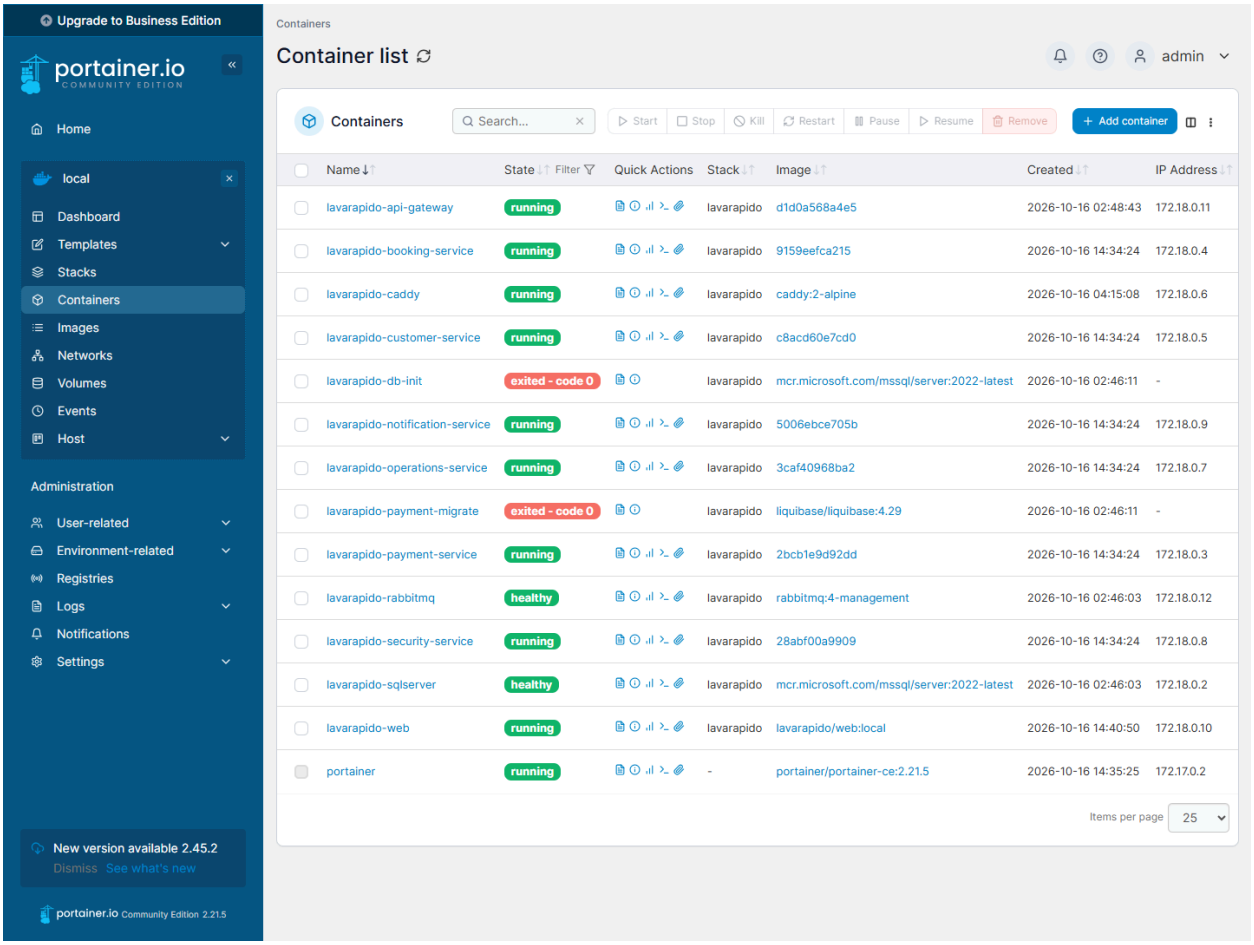

Los 11 servicios en running / healthy*; `db-init` y `payment-migrate` terminan en* exited - code 0 *porque son de una sola ejecución (crear la base y aplicar las migraciones de payment).*

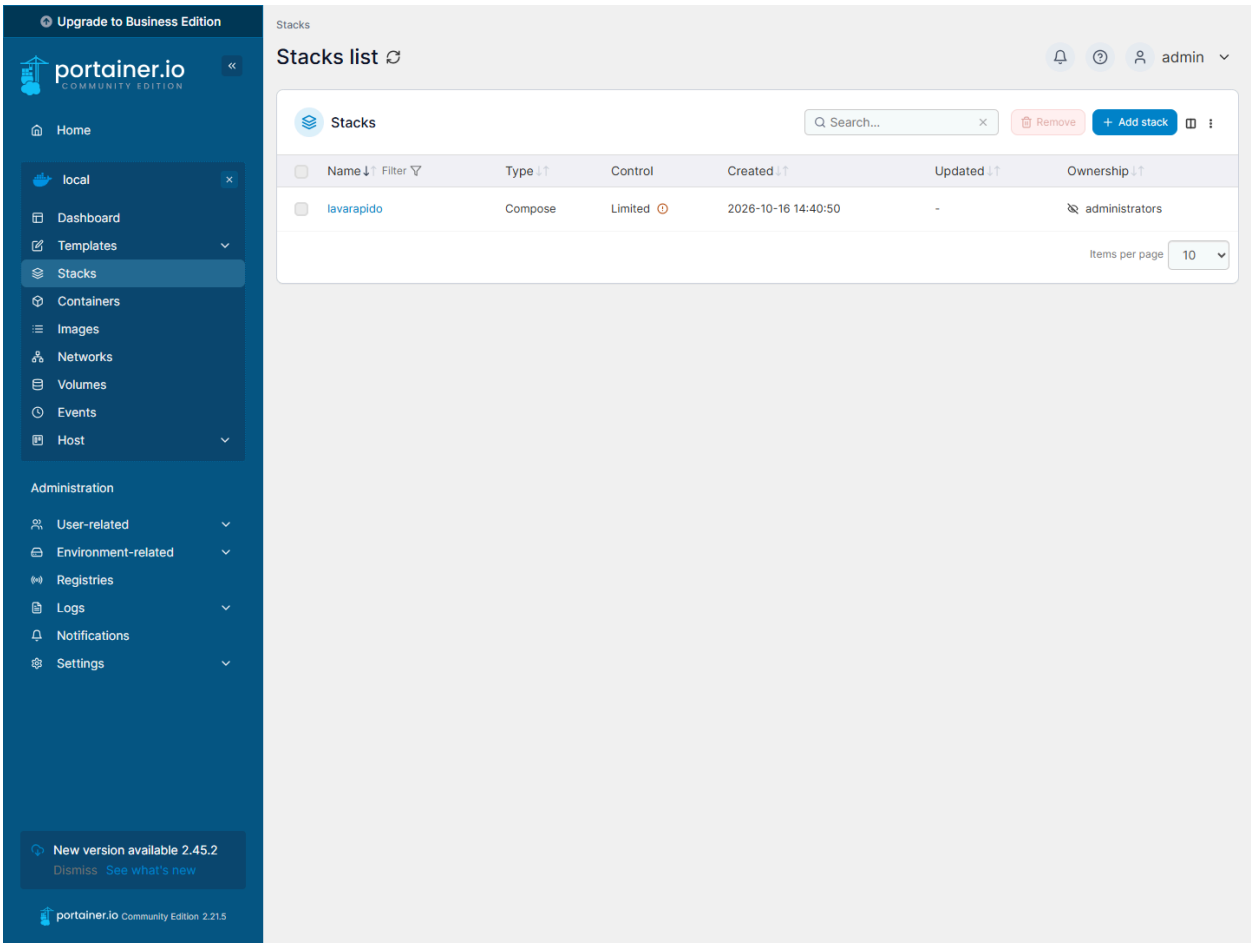

```
azureuser@vehiclecarwash-vm: ~/lavarapido/lavarapido-infra

$ sudo docker compose ... --profile app ps --format "table {{.Name}}\t{{.Status}}"
NAME                              STATUS
lavarapido-api-gateway            Up 20 minutes
lavarapido-booking-service        Up 20 minutes
lavarapido-caddy                  Up 20 minutes
lavarapido-customer-service       Up 20 minutes
lavarapido-db-init                Exited (0) 11 hours ago
lavarapido-notification-service   Up 20 minutes
lavarapido-operations-service     Up 20 minutes
lavarapido-payment-migrate        Exited (0) 11 hours ago
lavarapido-payment-service        Up 19 minutes
lavarapido-rabbitmq               Up 20 minutes (healthy)
lavarapido-security-service       Up 20 minutes
lavarapido-sqlserver              Up 20 minutes (healthy)
lavarapido-web                    Up 20 minutes

$ sudo docker stats --no-stream
NAME                              CPU %     MEM USAGE / LIMIT
lavarapido-operations-service     0.07%     327.1MiB / 512MiB
lavarapido-web                    0.00%     11.89MiB / 64MiB
lavarapido-payment-service        0.06%     77.93MiB / 384MiB
lavarapido-api-gateway            0.12%     175.8MiB / 512MiB
lavarapido-security-service       0.08%     310.5MiB / 512MiB
lavarapido-booking-service        0.05%     340.8MiB / 512MiB
lavarapido-notification-service   0.06%     325.6MiB / 512MiB
lavarapido-customer-service       0.05%     292.1MiB / 512MiB
portainer                         0.00%     61.34MiB / 7.698GiB
lavarapido-caddy                  0.00%     60.26MiB / 64MiB
lavarapido-rabbitmq               0.11%     148.2MiB / 7.698GiB
lavarapido-sqlserver              0.79%     776.7MiB / 7.698GiB
```

Estado tomado desde la terminal el 19-10-2026: los 11 contenedores del sistema en Up (SQL Server y RabbitMQ en healthy*), `db-init` y `payment-migrate` en* Exited (0)*, y el consumo de memoria de cada contenedor.*

5.4.2 Captura De Visor De Logs De Los Servicios Backend


```
azureuser@vehiclecarwash-vm: ~/lavarapido/lavarapido-infra

$ for s in ...; do docker logs lavarapido-$s | grep "Started"; done
lavarapido-api-gateway            Started ApiGatewayApplication in 44.795 seconds
lavarapido-security-service       Started SecurityServiceApplication in 89.425 seconds
lavarapido-customer-service       Started CustomerServiceApplication in 84.89 seconds
lavarapido-booking-service        Started BookingServiceApplication in 87.708 seconds
lavarapido-operations-service     Started OperationsServiceApplication in 91.131 seconds
lavarapido-notification-service   Started NotificationServiceApplication in 88.861 seconds
lavarapido-payment-service        Now listening on: http://0.0.0.0:3005

$ docker compose ... logs --since 15m | grep -ciE "ERROR|Exception|APPLICATION FAILED"
0
```


Cada servicio Java muestra Started … in N seconds *(entre 45 y 91 segundos con la máquina recién encendida) y payment* Now listening on :3005*. Hay 0 trazas con error en los últimos 15 minutos.*

5.4.3 Captura De Respuesta HTTP 200 De Los Health Checks

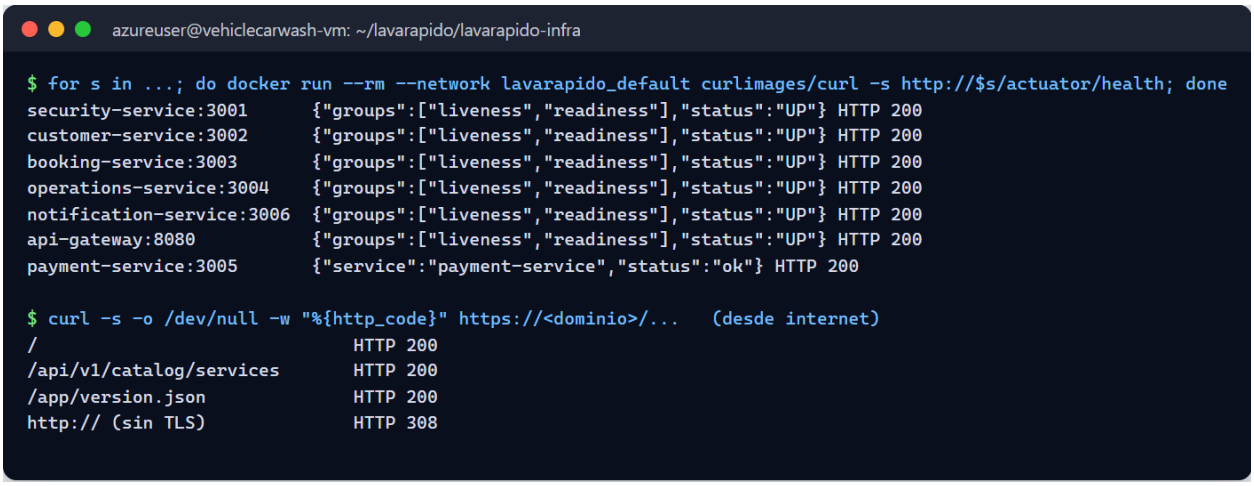


`/actuator/health` responde `UP` (HTTP 200) en los 6 servicios Java desde la red interna y payment-service responde `ok`. Desde internet, la web, la API y `/app/version.json` responden 200, y HTTP redirige a HTTPS con 308.

5.4.4 Captura De Interfaz Web Con Consola DevTools Limpia

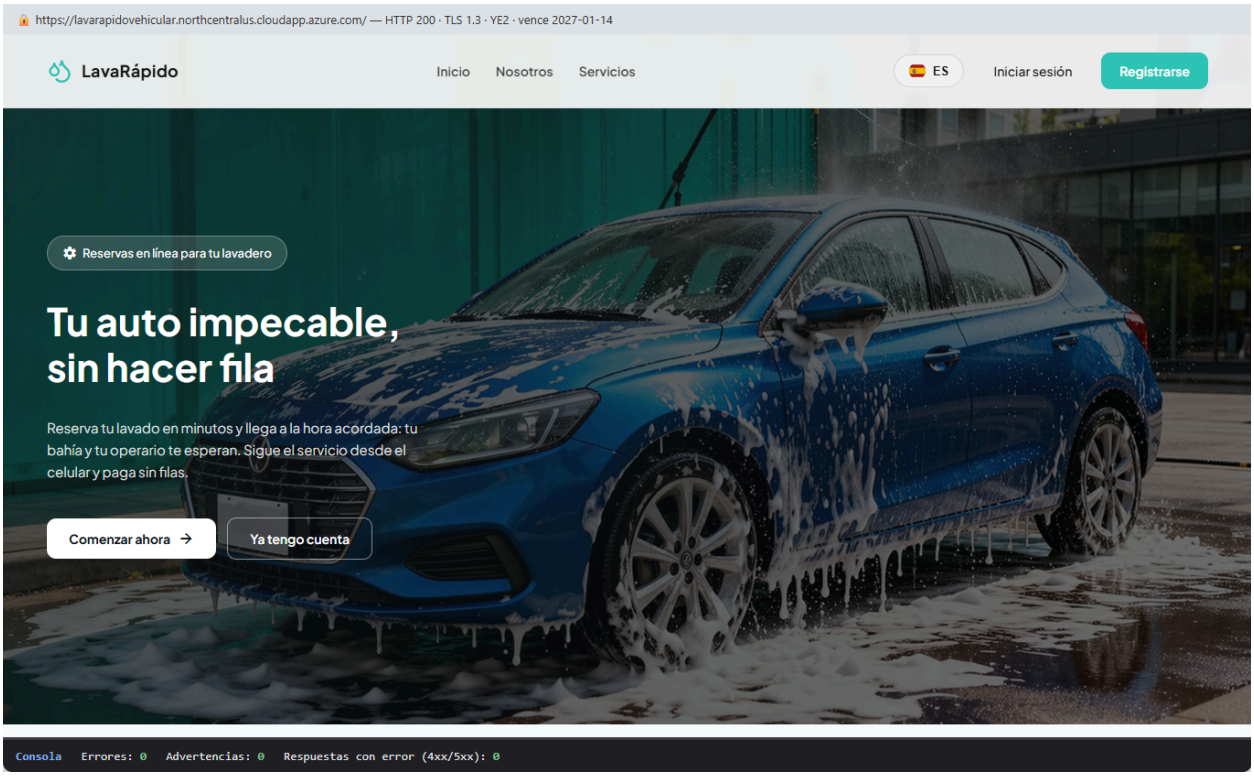

Portada en producción por HTTPS (TLS 1.3, certificado de Let's Encrypt vigente hasta el 14-01-2027). Al cargar: 0 errores y 0 advertencias en la consola, y 0 respuestas con error.

5.4.5 Captura De Registro De Migración Exitosa En Base De Datos

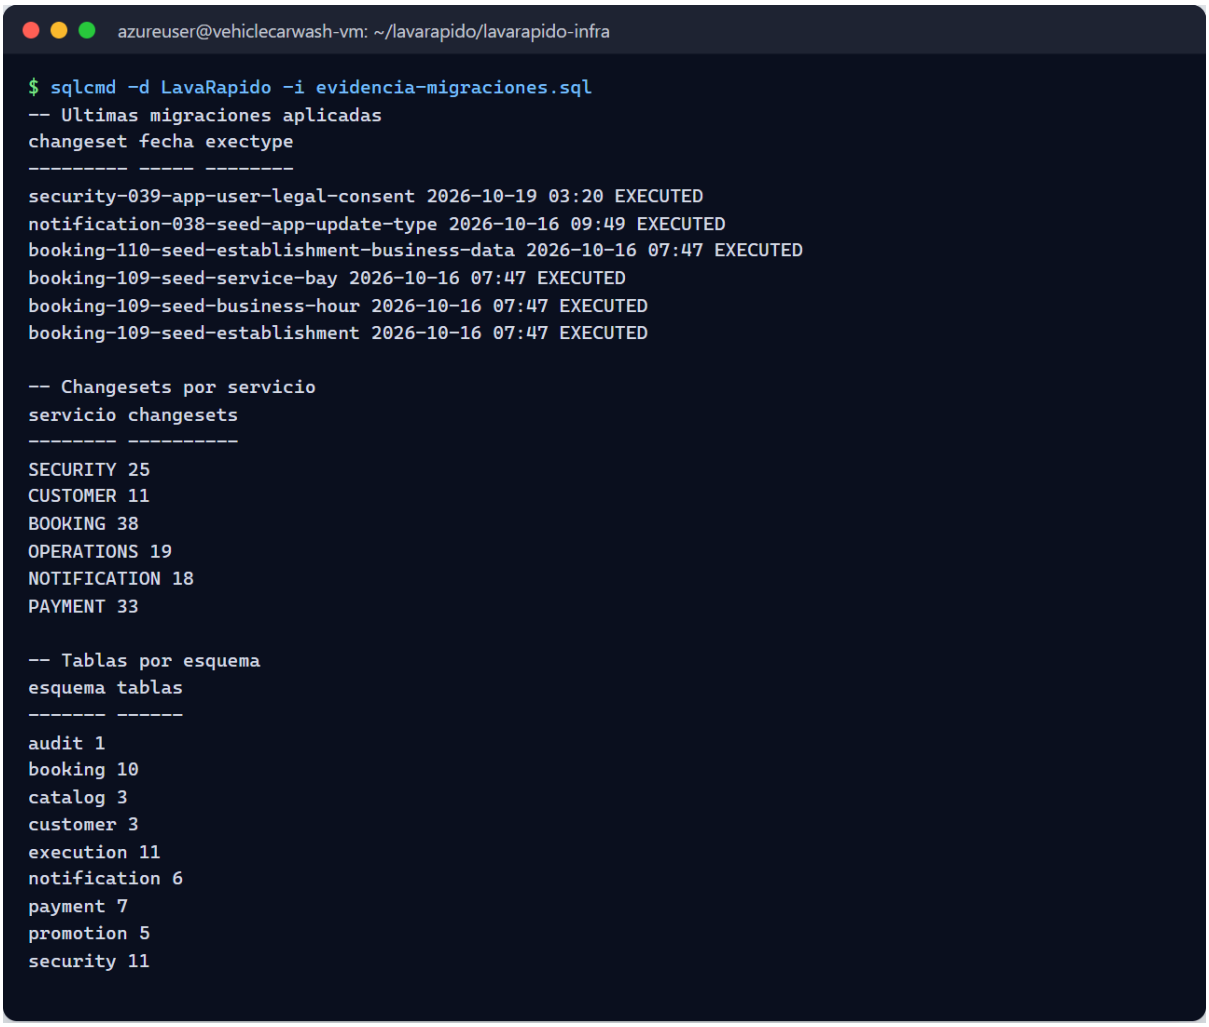

La 039 (aceptación de los documentos legales) quedó aplicada el 19-10-2026; hay 144 changesets `EXECUTED` en los 6 historiales y 57 tablas en los 9 esquemas. Desde la migración 047 de notification (24-10-2026, `pending_delivery`) son 58 tablas.

Documentos relacionados:

- `lavarapido-infra/DEPLOY.md`: guía corta de despliegue y actualización.
- `lavarapido-infra/e2e/README.md`: pruebas entre servicios.
- `vehicle-w-docs`: arquitectura (ADR), OpenAPI y eventos.
